



PLAN DE MEJORA EN AGUA Y SANEAMIENTO

CASERÍO CHIRIJSACASIGUAN, NAHUALÁ.

Centrados en el objetivo de garantizar el acceso al agua y a la salud como derecho humano, este plan de mejoras contiene toda la información necesaria para establecer un perfil claro de las condiciones sanitarias actuales de la comunidad evaluada, propone un grupo de soluciones y mejoras del sistema sanitario con un presupuesto priorizado que permita mejorar también la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias encargadas de operar los sistemas de agua y saneamiento.

PROYECTO RUK'U X'YA'

CRÉDITOS

Edición



Texto y contenido:

Responsables Técnicos del Programa RUK'U'X YA', HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala.

Diseño y diagramación:

Ana Isabel Mendoza
Coordinadora de Comunicación y Relaciones Públicas.
HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala.

Asesoría y Revisión Equipo Programa RUK'U'X YA'

Rene Estuardo Barreno
Coordinador General, Programa RUK'U'X YA'.
Acción contra el Hambre.

Silvia María Castillo Arana
Coordinadora Técnica, Programa RUK'U'X YA'.
HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala.

Giezy Joezer Sánchez Orozco
Responsable Técnico en Gestión del Agua, Programa RUK'U'X YA'.
HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala.

Fotografías:

Ing. Moisés Chay y HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala.

Municipalidad de Nahualá:

Manuel Guarchaj Tzep
Alcalde Municipal.

“Esta publicación cuenta con la colaboración del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del Programa RUK'U'X YA' y no refleja, necesariamente, la postura de la AECID”.



Contenido

Índice de tablas.....	6
FICHA TÉCNICA.....	1
Resumen ejecutivo.....	2
Resumen del estado actual del sistema de agua y saneamiento, las mejoras que se deben implementar.....	3
Estado de saneamiento.....	4
Localización de la zona de estudio.....	5
Datos generales de la comunidad.....	6
Objetivos del plan.....	7
Objetivo General.....	7
Objetivos Específicos.....	7
Información del sistema de agua y saneamiento.....	8
Mapa de ubicación de la comunidad y del sistema de agua y saneamiento.....	9
Diagrama de flujo del proceso del sistema de agua evaluado.....	10
Determinación de los peligros y eventos peligrosos y evaluación de los riesgos.....	11
Análisis del saneamiento en la comunidad.....	19
Análisis de la disposición de aguas residuales.....	19
Descripción de sistema de aguas residuales.....	19
Descripción de la disposición de excretas.....	19
Análisis de la disposición de residuos sólidos.....	20
Descripción de disposición de desechos sólidos.....	20
Consecuencias de la disposición actual del sistema sanitario.....	20
Proyecto de mejoramiento de sistema de saneamiento.....	20
Estado de enfermedades de origen hídrico.....	21
Análisis de la oferta.....	22
Análisis de la demanda.....	23
Análisis de la capacidad de almacenamiento.....	23
Principales mejoras identificadas del sistema de agua.....	26
Mejoras en el sistema de agua a corto plazo.....	26
Mejoras en el sistema de agua a mediano plazo.....	27



Mejoras en el sistema de agua a largo plazo	27
Mejoras identificadas del sistema de agua que pueden ser implementadas por la comunidad	27
Principales mejoras identificadas de saneamiento	28
Mejoras en el sistema de saneamiento a corto plazo.....	28
Mejoras en el sistema de saneamiento a mediano plazo	28
Mejoras en el sistema de saneamiento a largo plazo	28
Principales mejoras identificadas de residuos sólidos	29
Hoja de ruta para la gestión de mejoras	30
Análisis de sostenibilidad	31
Técnica	31
Saneamiento básico.....	32
Ambiental.....	33
Presupuesto de mejoras	34
Manual de operación y mantenimiento	35
Operación:.....	35
OPERACIÓN.....	35
MANTENIMIENTO.....	37
Mantenimiento:	37
Cronograma de operación y mantenimiento	39
Medición de potencial de Hidrogeno.....	41
Mapa de visitas domiciliarias.....	42
Control de la calidad de agua.....	43
Anexo 1:	46
Análisis de sostenibilidad técnica:	46
Análisis de sostenibilidad ambiental:	50
Anexo 2: Presupuesto de mejoras.....	53
Presupuesto Integrado	53
Presupuesto desglosado	54
ANEXO 3: PLANOS.....	61
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	67
GENERALIDADES.....	67
SUJECIÓN A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS.....	67



LINEAMIENTOS GENERALES	67
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD.....	67
NORMAS DE SEGURIDAD.....	68
TRÁMITES Y PERMISOS	68
PRUEBAS Y OTROS RENGLONES.....	68
LIMPIEZA FINAL.....	68
RESPECTO A LOS PROYECTOS.....	68
RENGLONES DE TRABAJO A CONSIDERAR	69
LIMPIA, CHAMPEO Y DESTRONQUE.....	69
CAPTACIÓN (NACIMIENTO).....	69
LÍNEA DE CONDUCCIÓN	69
VÁLVULAS DE LIMPIEZA.....	69
CAJA ROMPE PRESIÓN (con y sin válvula de flote).....	69
PASOS AÉREOS	69
PASOS DE ZANJÓN	70
RED DE DISTRIBUCIÓN.....	70
VÁLVULA DE COMPUERTA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN	70
COLORADOR DE PASTILLAS.....	70
TANQUE DE DISTRIBUCIÓN.....	71
CERCO PERIMETRAL	71
LETRINA.....	71
SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA VIVIENDA.....	72
POZO DE ABSORCIÓN	72
EJECUCIÓN.....	72
LIMPIA, CHAPEO Y DESMONTE	72
OBRAS PERMANENTES.....	72
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA.....	73
GENERALIDADES.....	73
ZANJEO	74
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC	74
RELLENO DE ZANJAS.....	75
LAVADO Y DESINFECCIÓN INTERIOR DE LA TUBERÍA	75



DISEÑO DE LA MEZCLA.....	76
CALIDAD DE LA MEZCLA	76
DOSIFICACIÓN DE AGREGADOS.....	76
CONSISTENCIA.....	76
DOSIFICACIÓN DEL AGUA	76
VACIADO DEL CONCRETO.....	76
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	76
REFUERZO Y EMPOTRADOS	77
TEMPERATURA	77
TIEMPO DE COLOCACIÓN	77
SEGREGACIÓN.....	77
DESCARGA DEL CONCRETO.....	77
CAPACIDAD DE COLOCACIÓN.....	77
CURADO DEL CONCRETO	78
ESPECIFICACIÓN	78
PROCESO	78
COMPACTACIÓN Y RELLENO ESTRUCTURAL.....	78
MATERIALES.....	78
TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC.....	78
MATERIAL DE RELLENO Y COMPACTACIÓN.....	79
CONCRETO CICLÓPEO	79
CONCRETO	79
MAMPOSTERÍA DE PIEDRA.....	79
ALISADO.....	80
REPELLO.....	80
REFUERZO	80
CEMENTO.....	80
AGREGADO FINO	80
AGREGADO GRUESO	81
BLOCK VACÍO DE CONCRETO.....	82
MADERA.....	82
AGUA.....	83



CAL	83
SEGURIDAD	83
Bibliografía.....	83



Índice de tablas

Tabla 1: Ficha técnica del sistema de agua y saneamiento abordado	1
Tabla 2: Estado del sistema de agua	4
Tabla 3: Estado de saneamiento	5
Tabla 4: Localización del estudio	5
Tabla 5: Datos generales	6
Tabla 6: Servicios básicos.....	7
Tabla 7: Información del sistema de agua	8
Tabla 8: Tabla de peligros en las fuentes.....	11
Tabla 9: Tabla de peligros en sistema de desinfección.	15
Tabla 10: Tabla de peligros en red de distribución.....	15
Tabla 11: Tabla de peligros en puntos de consumo.....	16
Tabla 12: Tabla de análisis de demanda..	24
Tabla 13 Mejoras en el sistema de agua a corto plazo.....	26
Tabla 14 Mejoras en el sistema de agua a mediano plazo	27
Tabla 15 Mejoras del sistema de agua que pueden ser implementadas por la comunidad	27
Tabla 16 Mejoras en el sistema de saneamiento a corto plazo	28
Tabla 17: Tabla de sostenibilidad técnica de agua.	31
Tabla 18: Tabla de sostenibilidad de saneamiento básico.....	32
Tabla 19: Tabla de sostenibilidad ambiental.	33


FICHA TÉCNICA



Objetivo:	Determinar las inversiones prioritarias para asegurar la provisión del servicio de agua apta para consumo humano y saneamiento asignando los recursos humanos, financieros y materiales necesarios	
Alcance Geográfico:	Nahualá.	
Institución implementadora:	Cocode de Caserío Chirijsacasiguan, Nahualá.	
Componentes:	Técnico y Ambiental	
Beneficiarios:	Aumentar la calidad, cantidad y cobertura de agua en el área rural del Caserío Chirijsacasiguan del municipio de Nahualá para 150 personas	
Opciones de Financiamiento:	Fondos Propios, Presupuesto municipal, fondos del Consejos de Desarrollo.	
Periodo de ejecución:	3 años	
Acciones estratégicas:	Aprobación del Plan por parte del comité de agua del Caserío Chirijsacasiguan, para darle legitimidad y carácter de oficial, apoyar la institucionalización del servicio fortaleciendo la DAS	
	Sensibilizar al área rural, dar a conocer los costos de operación y mantenimiento del servicio, implementar acciones para mejorar la sostenibilidad.	
	Fomentar la transparencia en la administración y operación del sistema.	
	Actualizar el reglamento del servicio	
	Realizar censo para actualizar usuarios e identificar conexiones ilícitas	
Inversiones priorizadas	Implementación de plan de operación y mantenimiento	Q2,000.00
	Sensibilización sistema de desinfección	Q2,500.00
	Equipamiento a fontaneros	Q1,500.00
	Conformación de comité de agua y saneamiento	Q5,500.00
	Sensibilización de ahorro de agua	Q2,000.00
	Implementación SANTOLIC para lograr comunidad FIDAL	Q7,100.00
	Implementación de kit de higiene buco dental y lavado de manos	Q11,880.00
	Sensibilización manejo de residuos sólidos	Q2,500.00
	Trampas de grasa	Q22,250.45
	Pozo de absorción	Q19,416.41
	Sumidero	Q15,759.75
	Mejoramiento de captaciones	Q27,826.25
	Mejoramiento de líneas de conducción	Q107,298.00
Mejoramiento de tanques de distribución	Q15,177.71	

Tabla 1: Ficha técnica del sistema de agua y saneamiento abordado

Resumen ejecutivo



El sistema evaluado en el Caserío Chirijsacasiguan, Nahualá, actualmente está en funcionamiento, aunque empezó a presentar problemas hace aproximadamente 10 años.

El sistema dota a un total de 25 viviendas. Para realizar este plan de mejora se tomó como referencia la información proporcionada por el COCODE de la comunidad, también se obtuvo información disponible en el sector salud, se determinó en base a un muestreo estadístico con la visita a 20 viviendas de un total de 25.

No se cuenta con un plan de mejora para la comunidad que proporcione información del acceso, calidad y asequibilidad de los servicios de agua y saneamiento, de igual manera que oriente las intervenciones que puedan realizarse a corto, mediano y largo plazo, el presente plan da a conocer la descripción y estado actual del sistema de abastecimiento de agua así como el estado de saneamiento básico con enfoque de eliminación de excretas, determinación de peligros y evaluación de riesgos en cuanto a la calidad de agua, determinación de mejoras para mejorar la prestación de estos servicios, también se presenta la sostenibilidad técnica de agua y saneamiento así como ambiental.

La comunidad actualmente cuenta con un servicio de letrinas de hoyo seco para la disposición de excretas, para el tema de aguas grises no cuentan con ningún sistema de saneamiento ya que las aguas grises corren a flor de tierra, cuentan con letrinas de hoyo seco y taza lavable únicamente en la escuela. En el tema de residuos sólidos no cuentan con un sistema de recolección y disposición final, por lo cual las familias deben utilizar sistemas individuales de eliminación de basura quemando o enterrándola producida en los terrenos aledaños y en algunos casos la tiran en barrancos, actualmente la comunidad tiene problemas en cuanto a la disponibilidad de letrinas y sanitarios ya que no alcanza una cobertura total de saneamiento y algunas letrinas se encuentran en mal estado.

El sistema de abastecimiento de agua tiene 18 años de haberse construido según los miembros del COCODE. Los principales problemas identificados en el sistema están localizados en la línea de conducción. El sistema está formado por tres nacimientos con sus respectivas captaciones que llegan a una caja reunidora de caudales y alimentan a un



primer tanque, una cuarta captación que alimenta a un segundo tanque, existe una quinta captación que por ahora está inhabilitada ya que se dañó en un deslave y alimenta al primer tanque, la línea de conducción cuenta con un paso aéreo, el volumen del primer tanque es de 30.23 m³ y el volumen del segundo tanque es de 16.83 m³ y la red de distribución la cual también cuenta con un paso aéreo. Existen dos nacimientos nuevos que ya está a nombre de la comunidad y quieren captarlo para conducir el agua hacia el segundo tanque. También existen problemas de bajo mantenimiento, infraestructura vulnerable, específicamente en las captaciones, personal técnico permanente inexistentes, para proveer de un servicio adecuado y de calidad el sistema debe implementar mejoras que pueden ser implementadas por la comunidad, principalmente en la línea de conducción, actualmente hay algunas conexiones en la parte más lejana a las que no les llega agua en ciertas horas del día y en época de verano se reduce el caudal de las fuentes, el sistema no cuenta con sistema de desinfección, por lo que es altamente recomendable sugerir la implementación de dicho sistema de desinfección.

Resumen del estado actual del sistema de agua y saneamiento, las mejoras que se deben implementar

Estado del sistema de agua

Componente	Estado	Identificación de mejora	Presupuesto de mejora	Quien podría implementar la mejora	Recursos disponibles para mejora
Capacidades operadores de sistema de agua	Funcionando de manera deficiente	Fortalecimiento a operadores de sistema de agua a través de capacitaciones, implementación de manuales de O&M y equipamiento de equipo de fontanería	Q13,500.00	Entidad externa	Espacio de salón para capacitaciones
Captaciones	Funcionando de manera deficiente	Mejoras en protección y acceso a captaciones, limpieza de captaciones, construcción	Q27,826.25	Comunidad / Municipalidad / COCODE	Madera, Arena y piedra local.

		de nuevas captaciones			
Conducción	En funcionamiento	Implementación de una nueva línea de conducción para conducir el agua de dos nacimientos nuevos hacia el tanque 2	Q107,298.00	Comunidad / Municipalidad / COCODE	Madera, Arena y piedra local.
Tanques de distribución	Funcionando	Implementación de sistemas de desinfección en tanques y de circulación	Q15,177.71	Comunidad / Municipalidad / COCODE	Madera, Arena y piedra local.

Tabla 2: Estado del sistema de agua

Estado de saneamiento

Componente	Estado	Identificación de mejora	Presupuesto de mejora	Quien podría implementar la mejora	Recursos disponibles para mejora
Educación sanitaria	Sin funcionamiento	Implementación SANTOLIC	Q7,100.00	Entidad externa	Espacio de salón para capacitaciones
Educación en higiene preventiva	Sin funcionamiento	Capacitación para el lavado de manos, kit de higiene bucodental y lavado de manos,	Q11,880.00	Entidad externa	Espacio de salón para capacitaciones
Disposición de desechos sólidos	Sin funcionamiento eficiente	Sensibilización para el manejo de residuos sólidos	Q2,500.00	Entidad externa	Espacio de salón para capacitaciones
Trampa de grasa	Inexistente	Implementar tratamiento de aguas grises	Q22,250.45	Entidad Externa	Ninguno
Pozo de absorción	Inexistente	Implementar tratamiento de aguas grises	Q19,416.41	Entidad Externa	Ninguno

Sumidero	Inexistente	Implementar tratamiento de aguas grises	Q15,759.75	Entidad Externa	Ninguno
----------	-------------	---	------------	-----------------	---------

Tabla 3: Estado de saneamiento

Localización de la zona de estudio



Identificación	
Cabecera Municipal	Nahualá
Comunidad	Caserío Chirijsacasiguan
Colindancias	
Al norte	Municipio de Zunil, Quetzaltenango
Al Sur	Caserío Pacorral, Nahualá
Al Este	Aldea Tzanjuyup, Nahualá
Al Oeste	Caserío Chuichá, Nahualá
Coordenadas geográficas	
Latitud	14°44'37.92"N
Longitud	-91°25'27.19"W
Altura	2,619 msm
Extensión territorial	
Superficie	1 km ²
Microcuenca	Ixtacapa
Cuenca	Nahualate
Características particulares	
Clima	Templado
Rango de temperatura anual	7 °C - 19 °C
Rango de precipitación media	1092 mm/año
Tipo de suelo	Vitrands-Psamments-Orthents (Clasificación MAGA)
Uso de suelo y vegetación	Siembra y vivienda

Tabla 4: Localización del estudio

Datos generales de la comunidad



DATOS GENERALES	
Nombre:	Caserío Chirijcasiguan
Población:	150 habitantes
Personas/viviendas con acceso a agua del sistema evaluado	254 viviendas
Porcentaje de cobertura de agua	100 %
Personas/viviendas con acceso a saneamiento	23 viviendas
Porcentaje de cobertura de saneamiento	92 %
Costo de acceso a un servicio de abastecimiento de agua	Q 1,500.00 Un meses
Costo de acceso a un servicio de saneamiento letrina/drenaje	Q 1,500.00

Tabla 5: Datos generales



SERVICIOS BÁSICOS	
Educación:	Escuela primaria



Salud	Centro de salud cercano
Energía Eléctrica	Toda la comunidad cuenta con servicio eléctrico
Principal actividad productiva	Agricultura

Tabla 6: Servicios básicos

Objetivos del plan



Objetivo General


Proporcionar mejoras al sistema de agua potable y saneamiento del Caserío Chirijcasiguan del municipio de Nahualá a corto, mediano y largo plazo que propicien la gestión de recursos para su buen funcionamiento garantizando el cumplimiento de los parámetros mínimos de garantía de derecho humano al agua y saneamiento, así como determinar la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de agua.

Objetivos Específicos

Presentar de manera sistematizada la información relevante del estado actual del sistema de agua y saneamiento del Caserío Chirijcasiguan del municipio de Nahualá a través de un análisis de funcionamiento.

Definir la caracterización del sistema de agua y saneamiento del Caserío Chirijcasiguan del municipio de Nahualá.

Información del sistema de agua y saneamiento



Nombre del sistema	Administrado por	Categoría	Tipo de sistema	Conexión	Caudal que ingresa al sistema	Cuenta con sistema de cloración	El sistema está en funcionamiento	Fuentes de agua utilizadas			Comunidades que abastece			
								Nombre de las fuentes utilizadas	Tipo de fuentes	Coordenadas de las fuentes	Nombre de la comunidad	Municipio	Población beneficiada	Viviendas beneficiadas
Caserío Chirijcasiguan	Cocode Caserío Chirijcasiguan	Rural	Por gravedad.	Domiciliar	0.64 l/s	No	Si	Río Ixtacapa	Nacimiento	Latitud 14.761245N Longitud -91.412105 Altura 2,761.2 msm	Caserío Chirijcasiguan	Nahualá	150	25
										Latitud 14.761126N Longitud -91.412534 Altura 2,712.3 msm				
										Latitud 14.761118N Longitud -91.412528 Altura 2,702.5 msm				
										Latitud 14.75267N Longitud -91.427723 Altura 2,665.7 msm				

Tabla 7: Información del sistema de agua

Mapa de ubicación de la comunidad y del sistema de agua y saneamiento



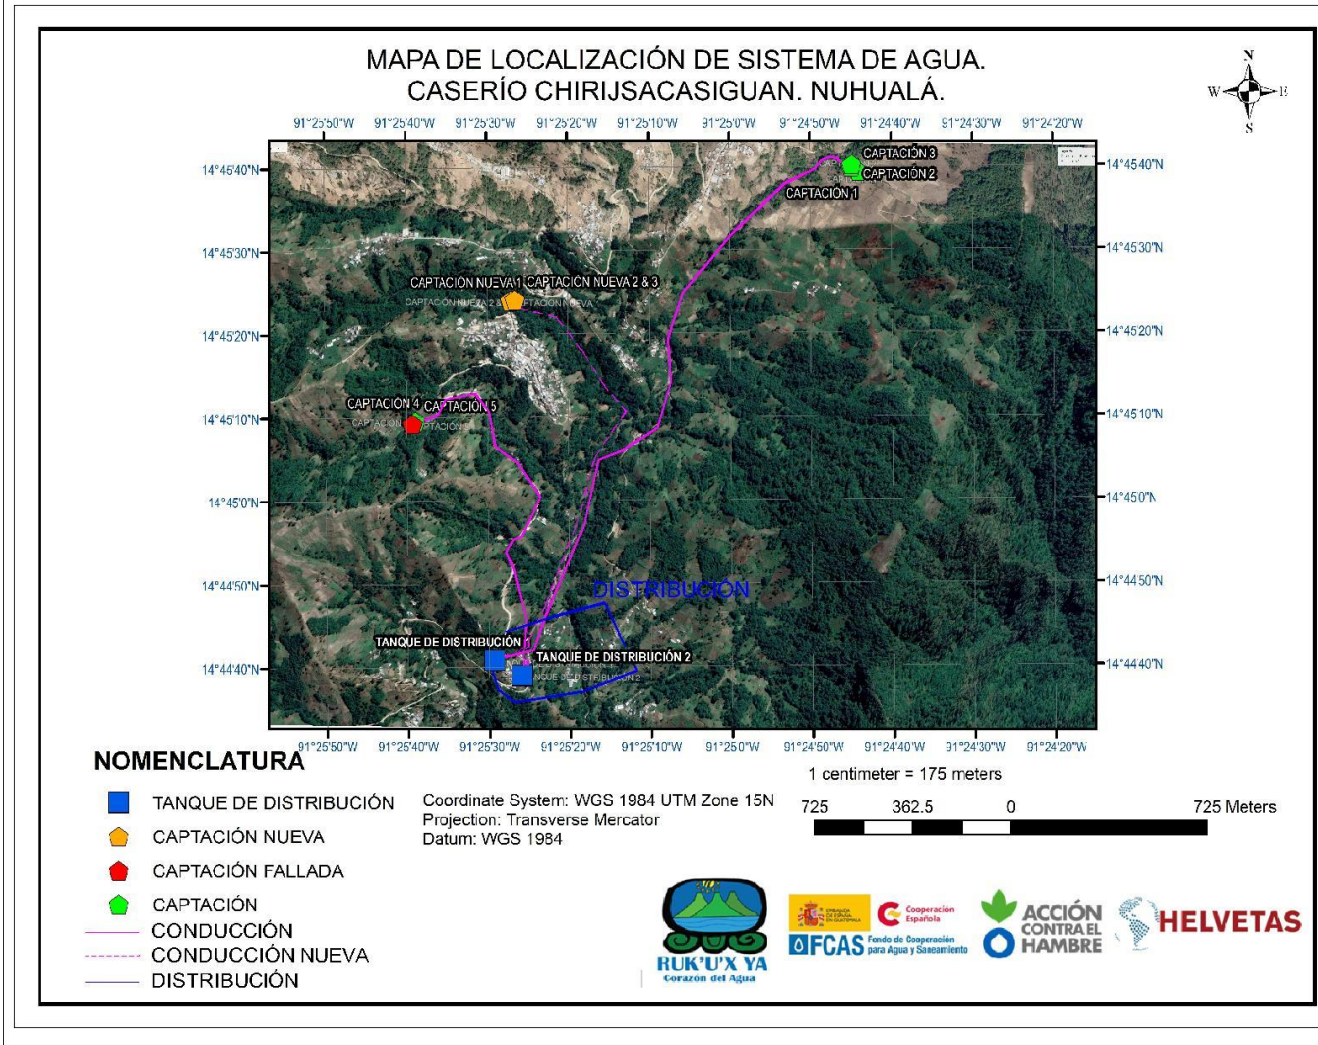


Diagrama de flujo del proceso del sistema de agua evaluado

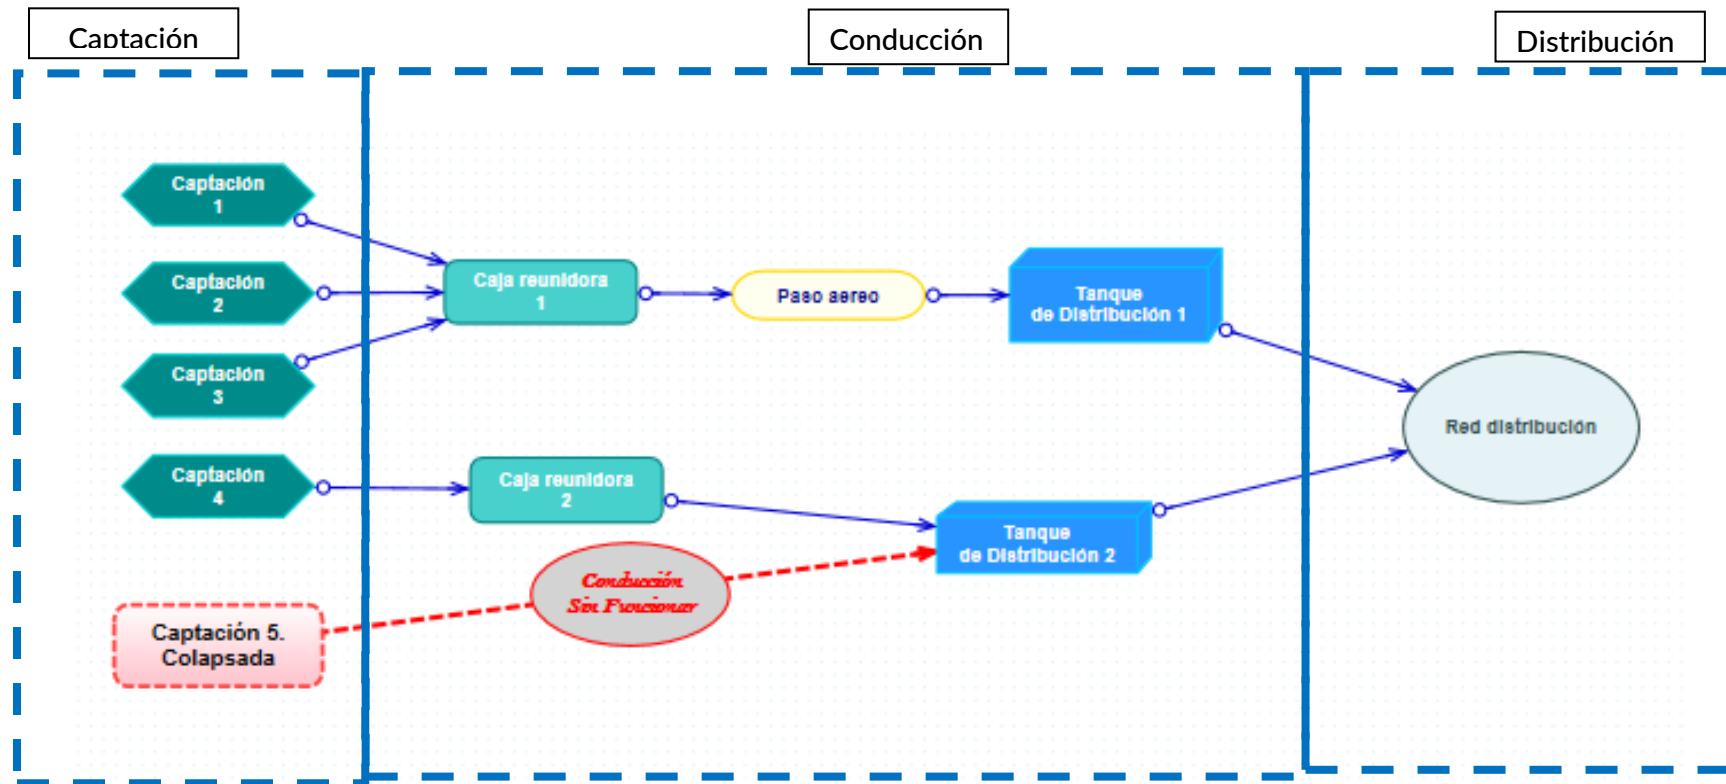

Determinación de los peligros y eventos peligrosos y evaluación de los riesgos



Determinación de peligros que pueden afectar a las fuentes.

Evento peligroso	Peligros asociados (y cuestiones que tener en cuenta)
Eventos meteorológicos y climáticos	Inundación, cambios rápidos en la calidad del agua de la fuente. Existe un tramo de línea de conducción colocado en zona poco accesible y riesgo de deslaves.
Variaciones estacionales	Cambios en la calidad del agua de la fuente.
Fauna	Contaminación microbiológica.
Acuífero no confinado	Cambios inesperados en la calidad del agua.
Inundación	Cantidad y calidad suficientes de agua cruda.
Rotura de tubería / tubería expuesta	Entrada de contaminación.

Tabla 8: Tabla de peligros en las fuentes.



Fotografía 1. Caja reunidora de caudales y tubería que no está enterrada

Elaboración propia.



Fotografía 2. Caja reunidora de tres captaciones

Elaboración propia



Fotografía 3. Área de nacimientos sin circulación

Elaboración propia



Fotografía 4. Tanque de distribución sin cerco perimetral.

Elaboración propia.



Fotografía 5. Tanque de distribución 2 sin cerco perimetral.

Elaboración propia.

Determinación de peligros que pueden afectar al tratamiento/desinfección.

Evento peligroso	Peligros asociados (y cuestiones que tener en cuenta)
Capacidad de las instalaciones de tratamiento	No se cuenta con instalaciones para la desinfección.
Desinfección	Fiabilidad, subproductos de la desinfección
Avería del tratamiento	Agua no tratada
Obstrucción de filtros	Eliminación insuficiente de partículas
Seguridad deficiente / vandalismo	Contaminación / corte de suministro
Rotura de tubería / tubería expuesta	Entrada de contaminación

Tabla 9: Tabla de peligros en sistema de desinfección.

Determinación de peligros que pueden afectar a la red de distribución.

Evento peligroso	Peligros asociados (y cuestiones que tener en cuenta)
Rotura de tubería / tubería expuesta	Entrada de contaminación
Intermitencia del suministro	Entrada de contaminación
Apertura y cierre de válvulas	Perturbación de depósitos por la inversión o modificación del flujo, introducción de agua viciada
Conexiones no autorizadas	Contaminación por contraflujo
Embalse de servicio con fugas	Entrada de contaminación
Acceso no protegido a embalse de servicio	Contaminación
Seguridad / vandalismo	Contaminación

Tabla 10: Tabla de peligros en red de distribución.

Determinación de peligros que pueden afectar a los puntos de consumo.

Evento peligroso	Peligros asociados (y cuestiones que tener en cuenta)
Conexiones no autorizadas	Contaminación por contraflujo
Tuberías de servicios de plástico	Contaminación por derrame de aceites o solventes

Tabla 11: Tabla de peligros en puntos de consumo.



Fotografía 6. Pila

Elaboración propia



Fotografía 7. Pila donde se observa el agua corriendo a flor de tierra

Elaboración propia



Fotografía 8. Conexión domiciliar sin pila

Elaboración propia.



Fotografía 9. Desperdicio de agua

Elaboración propia.



Análisis del saneamiento en la comunidad

El Caserío Chirijcasiguan del municipio de Nahualá está ubicado en un área montañosa con pendientes medias de entre 40% - 20%, es una zona templada con temperaturas medias entre 7°C - 19°C con una precipitación media de 1098 mm/año. Se estima un crecimiento demográfico anual de 3.5%. Los suelos son utilizados principalmente para cultivo de maíz, es una zona forestada en la región donde se encuentran los nacimientos mientras que en el área de concentración de las viviendas se tiene una alta deforestación, lo que supone un área con alta escorrentía y un riesgo alto para el funcionamiento inadecuado del sistema de saneamiento.


El Caserío Chirijcasiguan del municipio de Nahualá cuenta con letrinas de hoyo seco para el tratamiento de las excretas pero no cubren las viviendas en un 100% y se considera un 20% de letrinas en mal estado.

Los servicios públicos en la comunidad son una escuela primaria con retretes y lavamanos no cuenta con iglesias o industrias que generen desechos químicos ya que son una comunidad pequeña.

Análisis de la disposición de aguas residuales

Descripción de sistema de aguas residuales

No se cuenta con un sistema para el tratamiento de las aguas grises, las cuales son desechadas a flor de tierra luego del uso de las pilas, no todas las viviendas cuentan con pila y toda la población cuenta con temascal para su aseo personal.



Descripción de la disposición de excretas

La disposición de excretas en las viviendas se da en un 92 % con uso de letrinas de hoyo seco, las personas que no tienen letrina usan la letrina de algún vecino. La mayoría de las letrinas en uso están en buen estado y funcionando bien. Las letrinas usadas están hechas con materiales lavables no perecederos, lejanas a las viviendas, con paredes bien aisladas exceptuando algunas que únicamente tienen nylon para su recubrimiento. Las letrinas, en su mayoría no cuentan con tapadera. La limpieza interior en general es aceptable, aunque los recipientes de depósito de papel no cuentan con tapadera. Se puede observar que la presencia de vectores (moscas) es poca en todas las viviendas.

Análisis de la disposición de residuos sólidos

Descripción de disposición de desechos sólidos

La comunidad no cuenta con el servicio de tren de aseo y disponen de la basura inorgánica con incineración incontrolada y enterrando la basura orgánica en los terrenos de cultivo. Pudo observarse que no existe contaminación considerable en la comunidad y no existe tampoco una contaminación considerable en los lechos de los ríos aledaños a la comunidad. Sin embargo, se sugiere la implementación de educación sanitaria continua para mejorar el manejo de los desechos sólidos.



Consecuencias de la disposición actual del sistema sanitario

Como consecuencia del manejo actual de las aguas residuales y el manejo de residuos sólidos existen los siguientes riesgos:

- Contaminación del medio ambiente.
- Proliferación de vectores transmisores de enfermedades.
- Producción de malos olores.
- No disminución de índices de mortalidad por enfermedades de tipo sanitario.

Proyecto de mejoramiento de sistema de saneamiento

A través del análisis del sistema sanitario de la comunidad se plantean las siguientes soluciones para mejorar su sistema sanitario:

Aguas grises:

- Implementación de sumideros de pila, trampas de grasa y pozos de absorción

Disposición de residuos sólidos:

- Implementación de educación sanitaria continua para mejorar el manejo de los desechos sólidos.



Estado de enfermedades de origen hídrico



El centro de salud encargado de cubrir el área del Caserío Chirijcasiguan es el centro de salud del distrito 6 de Nahualá que se encuentra en el casco urbano del municipio de Nahualá.

Según la información proporcionada por dicho centro de salud se tiene un registro para lo que va del año 2021 que han habido 336 casos y ningún caso de cólera, fiebre tifoidea, polio, meningitis y hepatitis.

Otro factor importante son los casos de desnutrición. Según el sistema de información gerencial de salud -SIGSA- para el departamento de Sololá el registro más actualizado obtenido que es de 2019 se tuvieron 149 casos. En el caso particular de los casos registrados en el centro de salud distrito 6 de Nahualá en el año 2021 se tuvieron 5 casos de los cuales, 2 aún están en desnutrición aguda, 1 caso recuperado y 2 casos más que están en monitoreo y seguimiento para poder recuperarlos de la desnutrición aguda.

Análisis de la oferta



Para el sistema evaluado existen actualmente cuatro captaciones de tipo manantial que pueden alimentar al sistema de agua potable del Caserío Chirijcasiguan del municipio de Nahualá y alimentan a dos tanques de distribución. Las primeras tres captaciones se encuentran en la misma zona con una separación de aproximadamente 20 metros entre ellas, la fuente 4 y 5 están aproximadamente a 2 kilómetros de distancia de las primeras fuentes y entre ellas hay 30 metros aproximadamente. La región es llamada Chuatuj, es área de siembra. El caudal disponible en las captaciones es de 0.64 litros/segundo, lo que se traduce a un total de 62.208 m³/día que están disponibles en el sistema.

Para una población de 25 viviendas contabilizadas del Caserío Chirijcasiguan el caudal que tienen las cuatro captaciones es suficiente para cubrir las necesidades de la población.

La población servida con el sistema evaluado tiene agua en el tanque y está en funcionamiento.

Para mejorar la disponibilidad de agua principalmente en época de verano existen dos fuentes nuevas que ya están compradas por la comunidad y tienen un caudal de 0.04 litros/segundo la primera fuente y 0.22 litros/segundo la segunda fuente.

Análisis de la demanda




Actualmente existe un total de 25 viviendas conectadas al sistema evaluado del Caserío Chirijcasiguan con una cobertura del 100 % de las viviendas del caserío. El 100% de las viviendas cuentan con chorros aunque no todos están conectados a pilas de concreto, sin embargo, hace cerca de 3 años que el servicio de agua de este sistema comenzó a tener problemas en su funcionamiento.

Se estima una dotación de al menos 150 litros/habitante/día puesto que culturalmente pudo observarse que no se tiene una educación de ahorro de agua.

Es oportuno mencionar que pudo observarse que existen fugas en chorros y se encontraron varios chorros encendidos desaprovechando agua.

El caudal disponible en las captaciones es suficiente para las necesidades de la comunidad.

Análisis de la capacidad de almacenamiento



Se tienen dos tanques de distribución en el sistema de agua de la comunidad el primer tanque con volumen disponible de 30.23 m³ y el segundo tanque con un volumen disponible de 16.83 m³.

Se tiene un caudal disponible en los nacimientos 1, 2 y 3 de 0.20 litros/segundo el cual es capaz de llenar el tanque de distribución existente de 30.23 m³, el caudal del nacimiento 4 es de 0.44 litros/segundo el cual es capaz de llenar el segundo tanque de distribución de 16.83 m³, los nacimientos pueden mantener el volumen de los dos tanques en las horas pico, con una dotación de 150 litros/habitante/día.

El volumen de los dos tanques es suficiente para cubrir la demanda de la población actual.



Se presenta el siguiente cuadro con el análisis tanto del funcionamiento actual como el funcionamiento proyectado a 20 años.

Volumen almacenamiento disponible	47.06	m ³
Dotación	150.00	l/h/d
Habitantes por vivienda	6.00	h/v
Total de viviendas servidas	25.00	viviendas
Habitantes presentes	150.00	Hab
Crecimiento poblacional	3.50	%
Periodo proyectado	20.00	años
Habitantes futuros	299.00	Hab
Funcionamiento Actual		
Qm	0.26	l/seg
FDM	1.20	
Qdm	0.31	l/seg
DHM	1.80	
Qhm	0.47	l/seg
Factor reducción volumétrica	35.00	%
Volumen actual requerido almacenamiento	7.88	m ³
Funcionamiento para período proyectado (20 años)		
Qm	0.52	l/seg
FDM	1.20	
Qdm	0.62	l/seg
DHM	1.80	
Qhm	0.93	l/seg
Factor reducción volumétrica	35.00	%
Volumen futuro requerido almacenamiento	15.70	m ³

Tabla 12: Tabla de análisis de demanda..

Grafico Volumen disponible vs requerido de almacenamiento de agua. (m³)



Análisis de oferta-demanda


DEPARTAMENTO: Sololá
 MUNICIPIO: Nahualá
 CASERÍO: Chirisacasiguan

POBLACION:	150 personas.
DENSIDAD HABITACIONAL	6 personas/vivienda.
TIPO DE SISTEMA:	GRAVEDAD
VIVIENDAS CON SERVICIO DE AGUA	25 viviendas.
CAUDAL:	0.64 litros/segundo.
DOTACIÓN:	150.00 litros/habitante/día


CRECIMIENTO POBLACIONAL

2021	2022	2023	2024	2025	2026
150	155	161	166	172	178

Año	Producción Agua lts.	Necesidad Agua lts.
0	55296	22500
1	55296	23288
2	55296	24103
3	55296	24946
4	55296	25819
5	55296	26723

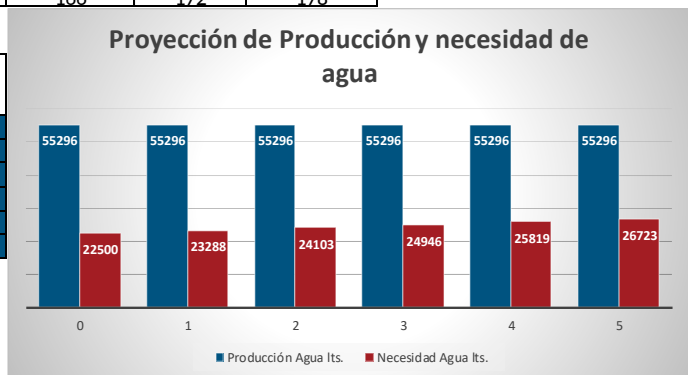

Principales mejoras identificadas del sistema de agua



Mejoras en el sistema de agua a corto plazo

Elemento/componente	Estado	Acciones de mejora	Presupuesto
Operadores de sistema de agua	Funcionando deficientemente	<ul style="list-style-type: none"> - Implementación de plan de operación y mantenimiento de sistemas de agua. - Sensibilización a la comunidad para la desinfección de agua - Equipamiento a operadores de sistema con equipo de fontanería 	Q13,500.00
Captación	En funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> - Limpieza de captaciones. - Cerco perimetral captación. - Enterrar tuberías. 	Q5,735.25
Tanque de distribución		<ul style="list-style-type: none"> - Cerco perimetral 	Q.4,768.00

Tabla 13 Mejoras en el sistema de agua a corto plazo

Mejoras en el sistema de agua a mediano plazo

Elemento/componente	Estado	Acciones de mejora	Presupuesto
Captación	Inexistente	- Captaciones nuevas	Q22,091.00
Línea conducción	Inexistente	- Línea de conducción nueva	Q107,298.00
Tanque de distribución	Inexistente	- Construcción de sistemas de desinfección en ambos tanques	Q10,409.71

Tabla 14 Mejoras en el sistema de agua a mediano plazo

Mejoras en el sistema de agua a largo plazo

No se proponen mejoras al sistema de agua a largo plazo

Mejoras identificadas del sistema de agua que pueden ser implementadas por la comunidad



Elemento/componente	Estado	Acciones de mejora	Presupuesto
Operadores de sistema		-	
Captación	Funcionando	- Limpieza de captaciones. - Cerco perimetral captación. - Enterrar tuberías.	Q5,735.25
Tanque de distribución	Funcionando	- Cerco perimetral	Q.4,768.00

Tabla 15 Mejoras del sistema de agua que pueden ser implementadas por la comunidad

Principales mejoras identificadas de saneamiento



Mejoras en el sistema de saneamiento a corto plazo

Elemento/componente	Estado	Acciones de mejora	Presupuesto
Educación Sanitaria	Deficiente	<ul style="list-style-type: none"> - Implementación SANTOLIC - Implementación de kit de higiene bucal y lavado de manos - Sensibilización para el manejo adecuado de residuos sólidos 	Q21,480.00

Tabla 16 Mejoras en el sistema de saneamiento a corto plazo

Mejoras en el sistema de saneamiento a mediano plazo


No existen mejoras a mediano plazo.

Mejoras en el sistema de saneamiento a largo plazo

Elemento/componente	Estado	Acciones de mejora	Presupuesto
Trampas de grasa, pozos de absorción y sumideros	Inexistente	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción de trampas de grasa para pilas. - Construcción de pozos de absorción. - Construcción de sumideros para pilas. 	Q57,426.61



Principales mejoras identificadas de residuos sólidos



No se tiene un sistema de servicio de tren de aseo e implementarlo implicará bastante educación sanitaria.

Por lo anterior la mejora planteada es la implementación de educación continua del manejo de la basura y los beneficios que este manejo trae consigo para la comunidad. Se plantea la implementación de un tren de aseo para la comunidad, aunque por la situación cultural y los hábitos en la comunidad se plantea esta mejora a largo plazo.

Hoja de ruta para la gestión de mejoras



Análisis de sostenibilidad

Técnica

Índice de sostenibilidad sistema de agua.			
Descripción del índice.	1	0.5	0
1 El sistema en su conjunto funciona correctamente conforme a los criterios establecidos en el diseño del proyecto ejecutivo	1	.	.
2 El sistema de agua funciona al menos 6 horas diarias continuadas para garantizar que el 100% de los usuarios tomados en cuenta en el proyecto se beneficien de agua potable	1	.	.
3 El sistema de agua arroja un caudal diario suficiente para abastecer a todos los usuarios, teniendo en cuenta la estacionalidad de las fuentes. (Cantidad de agua disponible)	1	.	.
4 El caudal que llega a los usuarios es igual o mayor a 50 litros/persona/día (Cantidad de agua de consumo)	1	.	.
5 Se han llevado a cabo capacitaciones técnicas para la prestación de los servicios de agua	.	.	0
6 Existen técnicos/fontaneros trabajando en el mantenimiento y funcionamiento del sistema de agua, cubriendo el 100% del sistema	.	.	0
7 Se realizan actividades de operación y mantenimiento en base a los Planes de O&M elaborados	.	.	0
8 Se han elaborado Planes de O&M y están al alcance de todas las personas interesadas o implicadas en el sistema	.	.	0
9 La tecnología implantada y decidida en conjunto con la población beneficiaria es la más asequible y la más apropiada para las condiciones locales estudiadas	1	.	.
10 El sistema de agua se encuentra a una distancia máxima de 500m-30min desde la vivienda al punto donde se toma el agua	1	.	.
11 Existen suministros, repuestos y servicios disponibles accesibles a la comunidad y es conocida por los responsables del mantenimiento del sistema	.	.	0
12 El prestador de servicios tiene capacidad suficiente y adecuada para disponer de personal en la diferentes actividades de operación y mantenimiento	.	.	0
13 El prestador de servicios tiene toda la documentación técnica del sistema (planos, diseños...) además de manuales y guías de mantenimiento y operación	.	.	0
	6	0	0
Factor de ponderación sobre 2 unidades enteras.			
0.153846154			
0.92			
Índice de sostenibilidad de agua.		Puntuación máxima	Puntuación obtenida
		13	6

Tabla 17: Tabla de sostenibilidad técnica de agua.

Saneamiento básico

Índice de sostenibilidad en saneamiento básico.			
Descripción del índice.	1	0.5	0
1 La accesibilidad física a dispositivos de disposición de excretas en hogares es total, estando cerca o dentro de los hogares y con caminos seguros para llegar a ellos.	1	.	.
2 Los dispositivos de saneamiento son seguros, previenen el contacto de las personas y animales con las excretas, permiten privacidad, principalmente para mujeres y niñas.	1	.	.
3 Los dispositivos considerados lavables cuentan con un tratamiento básico de las aguas que desechan, previniendo la presencia de contaminación fecal al aire libre.	.	.	0
4 La condición socioeconómica de las familias de la comunidad, les permite acceder a un dispositivo para disposición de excretas a un costo al alcance de todas y todos.	.	0.5	.
5 La presencia de estructuras de coordinación comunitaria que pudieran incidir en la gestión adecuada del saneamiento es relevante y se interesan en el tema.	.	.	0
6 La accesibilidad física en los lugares públicos, es total, estando cerca o dentro de ellos y con caminos seguros.	.	.	0
7 Los espacios públicos cuentan con tratamiento básico de excretas y aguas grises así como infraestructura para el lavado de manos.	.	0.5	.
8 El total de familias de la comunidad cuenta con un área y dispositivo de lavado de manos asociado al uso del baño o letrina.	.	0.5	.
9 No existen pañales desechables cuya disposición final es no adecuada, dentro de la comunidad por lo que no son una fuente de contaminación fecal al aire libre.	1	.	.
10 El total de familias de la comunidad cuentan con un tratamiento al menos básico de las aguas grises que desfogan.	.	.	0
11 El total de las familias de la comunidad conocen ¿Cómo? y realizan el mantenimiento a su sistema de tratamiento de aguas grises.	.	.	0
12 La forma de disposición final de los residuos sólidos generados en la comunidad es técnica y ambientalmente sostenible.	.	.	0
	3	1.5	0
Factor de ponderación sobre 2 unidades enteras. 0.16666667			
		Puntuación máxima	Puntuación obtenida
	0.75	12	4.5
Índice de sostenibilidad de saneamiento.			

Tabla 18: Tabla de sostenibilidad de saneamiento básico.

Ambiental



Índice de sostenibilidad ambiental			
Descripción del índice.	1	0.5	0
1 Existencia de áreas verdes o bosque alrededor de la fuente / toma de agua	.	.	0
2 Existencia de contaminación causada por basuras de hogares o por aguas servidas alrededor de la toma de agua (presencia de letrinas, animales, viviendas, basura doméstica, etc.) O se presentan indicios o riesgo de contaminación causada por productos químicos o residuos alrededor de la toma de agua con origen en actividades industriales	1	.	.
3 Tipo de erosión presente en la zona	.	0.5	.
4 Nivel de vulnerabilidad de riesgos	.	.	0
	1	0.5	0
Factor de ponderación sobre 2 unidades enteras.	1		
		Puntuación máxima	Puntuación obtenida
	1.50	4	1.5
Índice de sostenibilidad de saneamiento.			

Tabla 19: Tabla de sostenibilidad ambiental.

Presupuesto de mejoras



A continuación, se presenta el cuadro presupuestario en el que se resume el presupuesto total requerido para la implementación de las mejoras del sistema del Caserío Chirijsacasiguan del municipio de Nahualá. Tómese en consideración que este presupuesto representa precios comerciales tanto de materiales como de mano de obra, sin considerar costos indirectos como administración, supervisión y utilidades.

En el anexo 2 se presenta tanto los cuadros resumen como la integración unitaria de cada renglón.

No.	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SUBREGLON	PRECIO TOTAL SUBREGLON	PRECIO TOTAL RENGLON	NIVEL DE PRIORIDAD
1	FORTALECIMIENTO A OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE					Q 13,500.00	
1.1	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA	global	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00		CORTO PLAZO
1.2	SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA	global	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00		CORTO PLAZO
1.3	EQUIPAMIENTO A FONTANEROS O ENCARGADOS DE MANTENIMIENTO	global	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00		CORTO PLAZO
1.4	CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CASERÍO CHIRIJSACASIGUAN	global	1	Q 5,500.00	Q 5,500.00		CORTO PLAZO
1.5	SENSIBILIZACIÓN DE AHORRO DE AGUA	global	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00		CORTO PLAZO
2	FORTALECIMIENTO A SISTEMA DE SANEAMIENTO					Q 78,906.61	
2.1	IMPLEMENTACIÓN SANTOLIC PARA LOGRAR COMUNIDAD FIDAL	global	1	Q 7,100.00	Q 7,100.00		CORTO PLAZO
2.2	IMPLEMENTACIÓN DE KIT DE HIGIENE BUCODENTAL Y LAVADO DE MANOS	global	1	Q 11,880.00	Q 11,880.00		CORTO PLAZO
2.3	SENSIBILIZACIÓN PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	global	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00		CORTO PLAZO
2.4	TRAMPA DE GRASA	unidad	25	Q 890.02	Q 22,250.45		LARGO PLAZO
2.5	POZO DE ABSORCIÓN	unidad	25	Q 776.66	Q 19,416.41		LARGO PLAZO
2.6	SUMIDERO	unidad	25	Q 630.39	Q 15,759.75		LARGO PLAZO
3	CAPTACIÓN					Q 27,826.25	
3.1	LIMPIEZA DE CAPTACIONES	global	1	Q 800.00	Q 800.00		CORTO PLAZO
3.2	CERCO PERIMETRAL CAPTACIÓN	global	1	Q 4,253.00	Q 4,253.00		CORTO PLAZO
3.4	ENTERRAR TUBERÍA	global	1	Q 682.25	Q 682.25		CORTO PLAZO
3.5	CAPTACIÓN NUEVA	unidad	1	Q 22,091.00	Q 22,091.00		MEDIANO PLAZO
4	CONDUCCIÓN					Q 107,298.00	
4.1	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	unidad	1	Q 107,298.00	Q 107,298.00		MEDIANO PLAZO
5	TANQUE DE DISTRIBUCIÓN					Q 15,177.71	
5.1	SISTEMA DE DESINFECCIÓN TANQUE	unidad	2	Q 5,204.86	Q 10,409.71		MEDIANO PLAZO
5.2	CERCO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN	global	1	Q 4,768.00	Q 4,768.00		CORTO PLAZO
TOTAL DE MEJORAS A IMPLEMENTAR EN SISTEMA EXISTENTE						Q 242,708.57	

Manual de operación y mantenimiento









Operación:

Son todas aquellas actividades que se llevan a cabo en las instalaciones del sistema, para permitir su funcionamiento de acuerdo a lo planificado.

Evaluación de la operación: que se debe mejorar en la operación

OPERACIÓN

	<p>CAPTACIÓN</p>	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de pichachas de plástico en salida. Llave de paso en conducción y llave de paso de salida de limpieza en buen estado. 	<p>Revisión una vez por semana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cambiar llaves, reparar cercos, sellar fugas.
	<p>LÍNEA DE CONDUCCIÓN</p>	<ul style="list-style-type: none"> Llaves de paso hacia conducción y a través de la conducción en buen estado. Línea de conducción operativa el cien por ciento del tiempo. 	<p>Revisión a cada semana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cambiar un tramo de tubería de la línea de conducción actual. Al cambiar un tramo de la tubería debe también cambiar la posición de la línea de conducción hacia terreno firme.
	<p>TANQUE DE ALMACENAMIENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cerrar llave de limpieza llenar con agua y abrir la llave de paso del sistema de distribución. 	<ul style="list-style-type: none"> Revisión una vez por semana, luego de limpieza y desinfección del tanque. 	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar limpieza en cajas de válvulas para evitar contaminación y aumentar período de

		<ul style="list-style-type: none"> • Tapaderas íntegras. • Cerco perimetral íntegro. 		<p>vida útil de llaves de paso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construir cerco perimetral en área de tanque.
	PASO AÉREO y PASO DE ZANJÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Anclajes de tubería hacia pilares embebidos en concreto. • Garantizar que los pasos aéreos y de zanjón serán a través de tubos de hierro galvanizado. 	Revisión a cada mes.	
	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Válvulas en funcionamiento adecuado. • Regulación de llaves de paso para la línea de distribución. • Tapar todas las fugas existentes en la línea de distribución. 	Revisión una vez a cada 3 meses.	<ul style="list-style-type: none"> • Crear plano/croquis del sistema de distribución para identificar los elementos que conforman el sistema. • Mejorar limpieza en cajas de válvulas para evitar contaminación y aumentar período de vida útil de llaves de paso. • Sellar fugas creadas a través de todo el sistema.
	ACOMETIDAS DOMICILIARES	<ul style="list-style-type: none"> • Chorros operando. 	Una vez al mes.	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar frecuencia de revisión. • Crear croquis y listado de usuarios.



MANTENIMIENTO




Mantenimiento:



Es el conjunto de acciones que se realizan con la finalidad de prevenir y corregir daños que se producen en las instalaciones o componentes del sistema de agua.

Existe el mantenimiento preventivo que no es más que todas las acciones que se realizan antes de que se produzcan daños en el sistema de agua y así evitar problemas de funcionamiento; y existe el mantenimiento correctivo que es la acción de reparar daños por causa de accidentes o desgaste de los elementos del sistema.

Evaluación del mantenimiento: que se debe mejorar en el mantenimiento

	CAPTACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Inspección de: sello sanitario, existencia de charcos de agua, grietas en suelo u obra gris. • Inspección de cercos de protección. • Quitar vegetación, tierra, piedras o cualquier material extraño. • Chequear la presencia de animales alrededor. • Observar si existe deforestación alrededor. • Limpieza y desinfección de interior de captación. 	A cada semana.	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la limpieza de los sellos sanitarios. • Implementar cercos de protección. • Hacer desinfección con hipoclorito de calcio. • Mejorar frecuencia de revisión de estado de captaciones.
	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Inspección de elementos de línea de conducción. • Recubrir o enterrar tramos expuestos en línea de conducción. • Limpieza del terreno, quitando ramas, hierbas, rocas o cualquier material perjudicial. • Observar si existen fugas, deslizamientos o hundimientos de terreno. • Observar y eliminar empozamientos de agua sobre la línea de conducción. 	Una vez al mes.	<ul style="list-style-type: none"> • Recubrir tramos expuestos en línea de conducción. • Chequear con más frecuencia las válvulas de limpieza.

	<p>TANQUE DE ALMACENAMIENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeccionar y de ser necesario arreglar cerco. • Inspeccionar estado de candados en tapaderas. • Revisar estado de tuberías de rebalse, limpieza y ventilación. • Controlar filtraciones en tuberías de rebalse, limpieza, ingreso, salida. • Limpieza y desinfección del interior de tanque. • Inspeccionar estado de pintura exterior de tanque. Al menos una vez al año pintar con pintura resistente a la intemperie. • Inspeccionar cajas y llaves de paso, de ser necesario limpiar y pintar las partes metálicas con pintura anticorrosiva. • Hacer limpieza profunda en cajas de ingreso y salidas. • Inspeccionar si existen filtraciones en paredes, losas y en juntas muro-losa. 	<p>Una vez a la semana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reconstruir cerco perimetral. • Reparar protección de cajas de salida. • Mejorar regularidad de inspección.
	<p>PASO AÉREO O PASO DE ZANJÓN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de estado de pilas y columnas de anclaje. • Revisión de estado de cables cargadores. • Chequear en las bases de los soportes la existencia de socavamientos o hundimientos. • Revisión de fugas en uniones de tubos. 	<p>Una vez al mes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiar Tubería PVC por HG. • Cambiar cables cargadores.
	<p>LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar llaves de paso de la línea de distribución. Se deben abrir y cerrar varias veces de manera lenta para eliminar sedimentos. Lubricar con aceite de ser necesario. • Verificar que el paso de zanjón existente en la red de distribución se encuentre en buen estado. • Verificar caja rompe presión en línea de distribución 1. 	<p>Una vez por mes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar el paso de zanjón 1 y 2 para evitar posible colapso en caso de desbordamiento de ríos. • Inspeccionar cajas y llaves de paso y sustituir de ser necesario.

	<p>ACOMETIDAS DOMICILIARES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeccionar acometidas a fin de verificar que no se tengan fugas, reparar fugas de ser necesario. • Revisar los chorros de cada vivienda a fin de verificar y reparar fugas en los chorros. 	<p>Una vez por mes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar mantenimiento o preventivo de verificación una vez por mes del sistema de distribución S
	<p>SISTEMA DE DESINFECCIÓN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de caja y sistema de desinfección • Revisión de tapadera y sistema de seguridad de caja. • Inspección, limpieza y mantenimiento de accesorios y tubería de sistema de desinfección. 	<p>Revisión una vez por semana o menos en función del rendimiento de las pastillas de hipoclorito de calcio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de caja y accesorios de sistema de desinfección. • Implementación de sistemas de desinfección. • Implementación de sistema de control de cloro residual.


Cronograma de operación y mantenimiento






No.	Actividades	FRECUENCIA	Para un semestre (período en semanas)																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1 CAPTACIÓN																												
1.1	Inspección de pichachas de salida	Semanal																										
1.2	Tubería entre captación y cajas reunidoras de caudales, íntegra	Semanal																										
1.3	Llaves de paso operando correctamente	Semanal																										
1.4	Inspección de sello sanitario	Semanal																										
1.5	Inspección de cercos de protección	Semanal																										
1.6	Limpieza de vegetación, tierra, piedras o material extraño.	Semanal																										
1.7	Chequeo de animales o desechos de animales	Semanal																										
1.8	Chequeo de deforestación alrededor de la fuente	Semanal																										
1.9	Limpieza y desinfección de interior de captación	Semanal																										
2 VALVULAS DE PASO Y VALVULAS DE LIMPIEZA																												
2.1	Llaves de paso y válvulas de limpieza operando correctamente	Semanal																										
2.2	Observación de filtraciones o fugas en válvulas	Semanal																										
2.3	Observación de estado de tapaderas de cajas de válvulas	Semanal																										
2.4	Limpieza en el interior de cajas	Semanal																										
2.5	Mantenimiento de llaves, limpieza, lubricación y pintura	Semanal																										
3 LINEA DE CONDUCCIÓN																												
3.1	Llaves de paso en conducción operando correctamente	Mensual																										
3.2	Inspección de estado en elementos de línea de conducción	Mensual																										
3.3	Chequeo y recubrimiento de tubería expuesta	Mensual																										
3.4	Limpieza en zona de paso de línea de conducción	Mensual																										
3.5	Chequeo de fugas y filtraciones en línea de conducción	Mensual																										
3.6	Chequeo de empozamientos sobre línea de conducción	Mensual																										
4 TANQUE DE ALMACENAMIENTO																												
4.1	Operación de llaves de limpieza	Semanal																										
4.2	Inspeccionar y reparar cerco perimetral	Semanal																										
4.3	Inspeccionar y reparar tapaderas de tanque	Semanal																										
4.4	Revisión de estado de tuberías de rebalse, limpieza y ventilación	Semanal																										
4.5	Control de filtraciones en tuberías de rebalse, limpieza, ingreso y salida	Semanal																										
4.6	Limpieza y desinfección de interior de tanque	Semanal																										
4.7	Inspección de estado de pintura exterior	Anual																										
4.8	Inspección de cajas y llaves de paso	Mensual																										
4.9	Limpieza en interior de cajas de accesorios	Mensual																										
4.10	Inspección de filtraciones y grietas en muros y losa de tanque	Mensual																										
5 PASOS AEREOS Y PASOS DE ZANJON																												
5.1	Anclajes pila-tubo funcionando	Mensual																										
5.2	Revisión de pilas y anclajes de concreto	Mensual																										
5.3	Revisión de estado de cables cargadores	Mensual																										
5.4	Revisión de bases de soporte por socavamiento o hundimiento	Mensual																										
5.5	Revisión de fugas en uniones de tubos HG	Mensual																										
6 LINEA DE DISTRIBUCIÓN																												
6.1	Válvulas en funcionamiento	Trimestral																										
6.2	Regulación de llaves de paso	Trimestral																										
6.3	Inspección y reparación de válvulas en red de distribución	Mensual																										
6.4	Inspección de paso de zanjón en red de distribución	Mensual																										
6.5	Inspección caja rompe presión en línea de distribución	Mensual																										
7 LINEA DE DISTRIBUCIÓN																												
7.1	Chorros y acometidas operando	Mensual																										
7.2	Inspección de acometidas y chorros en busca de fugas	Mensual																										
8 SISTEMA DE DESINFECCIÓN																												
8.1	Implementación de sistema de desinfección	Una sola vez																										
8.2	Stock de pastillas de hipoclorito de calcio	Mensual																										
8.3	Limpieza de caja y sistema de desinfección	Semanal																										
8.4	Revisión de estado de caja y tapadera	Mensual																										
8.5	Inspección, limpieza y mantenimiento de accesorios de sistema	Semanal																										

Medición de potencial de Hidrogeno




No. Vivienda	PH medido
1	7.1
2	7.0
3	7.1
4	6.9
5	6.9
6	6.9
7	6.9
8	7.1
9	6.9
10	7.0
11	7.1
12	7.0
13	7.4
14	7.4
15	7.4
16	7.4
17	7.4
18	7.4
19	7.4
20	7.4

Mapa de visitas domiciliars

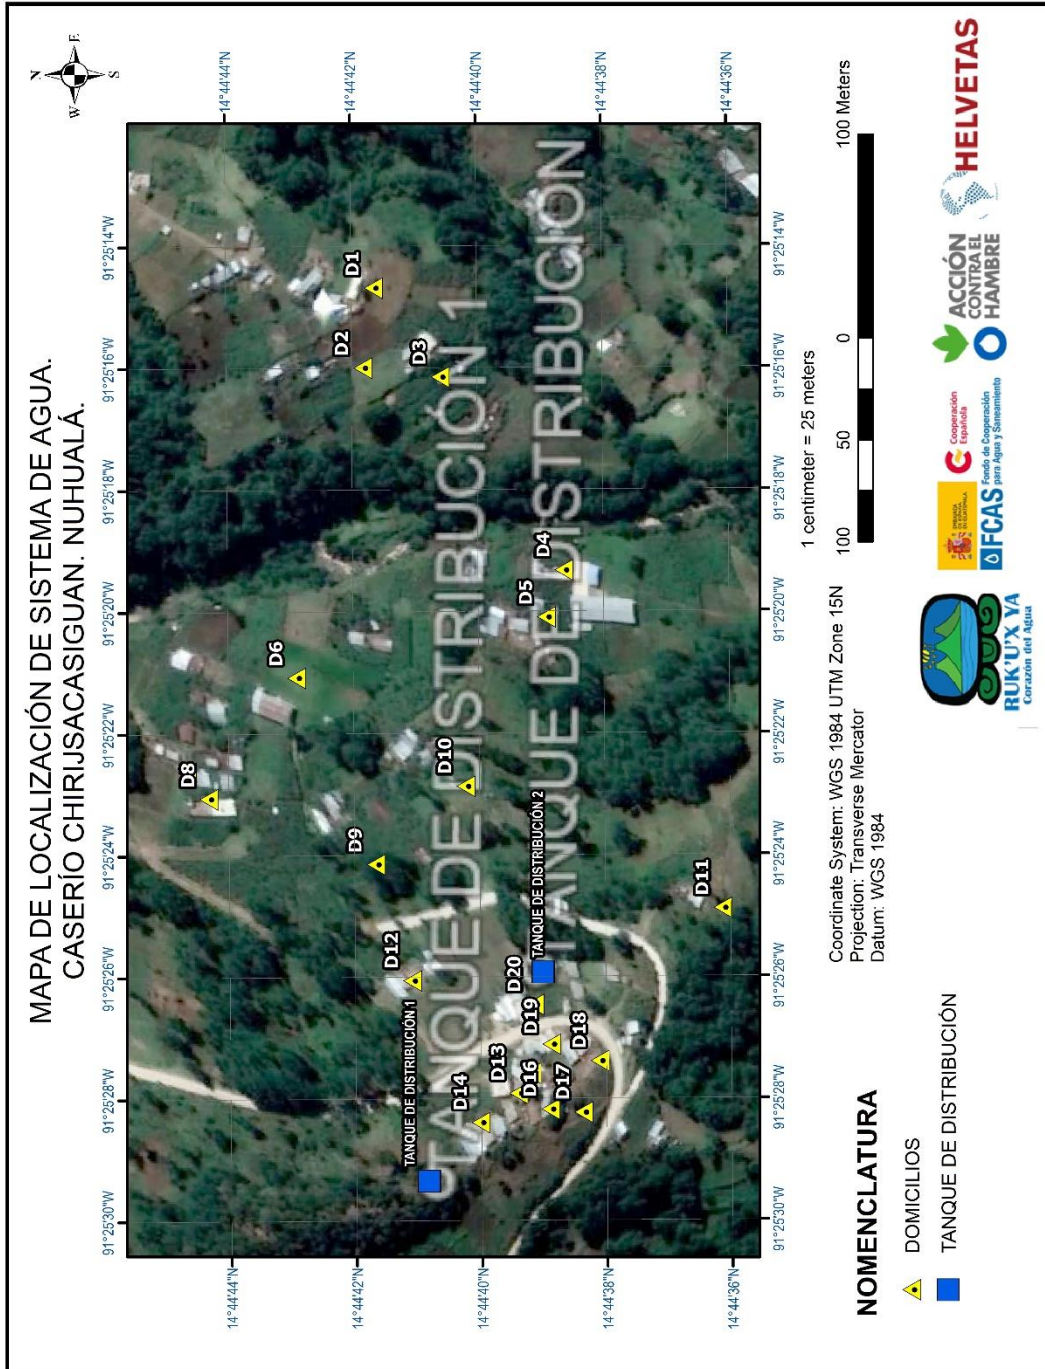

Control de la calidad de agua

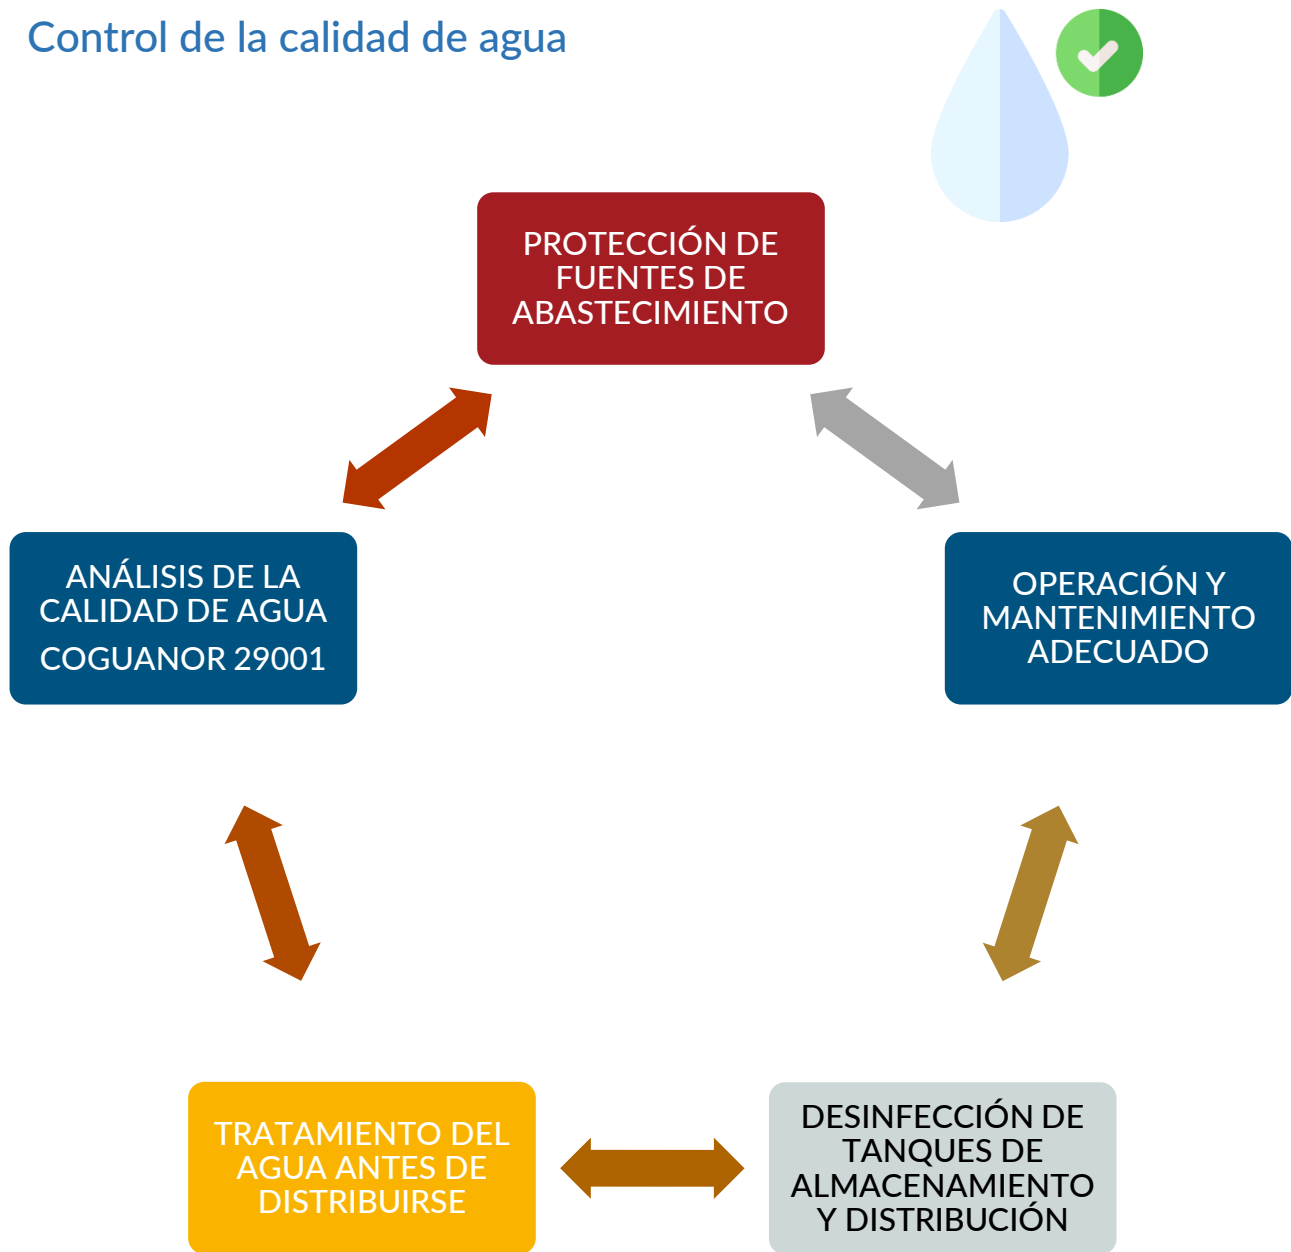

**Medición de cloro residual/
*COGUANOR 29001***

Semanalmente


**Medición de potencial de
Hidrógeno/ *COGUANOR 29001***

Semanalmente

**Coliformes fecales/ Escherichia
Coli/ *COGUANOR 29001***

al menos una vez por año

**Análisis mínimo/ *COGUANOR
29001***

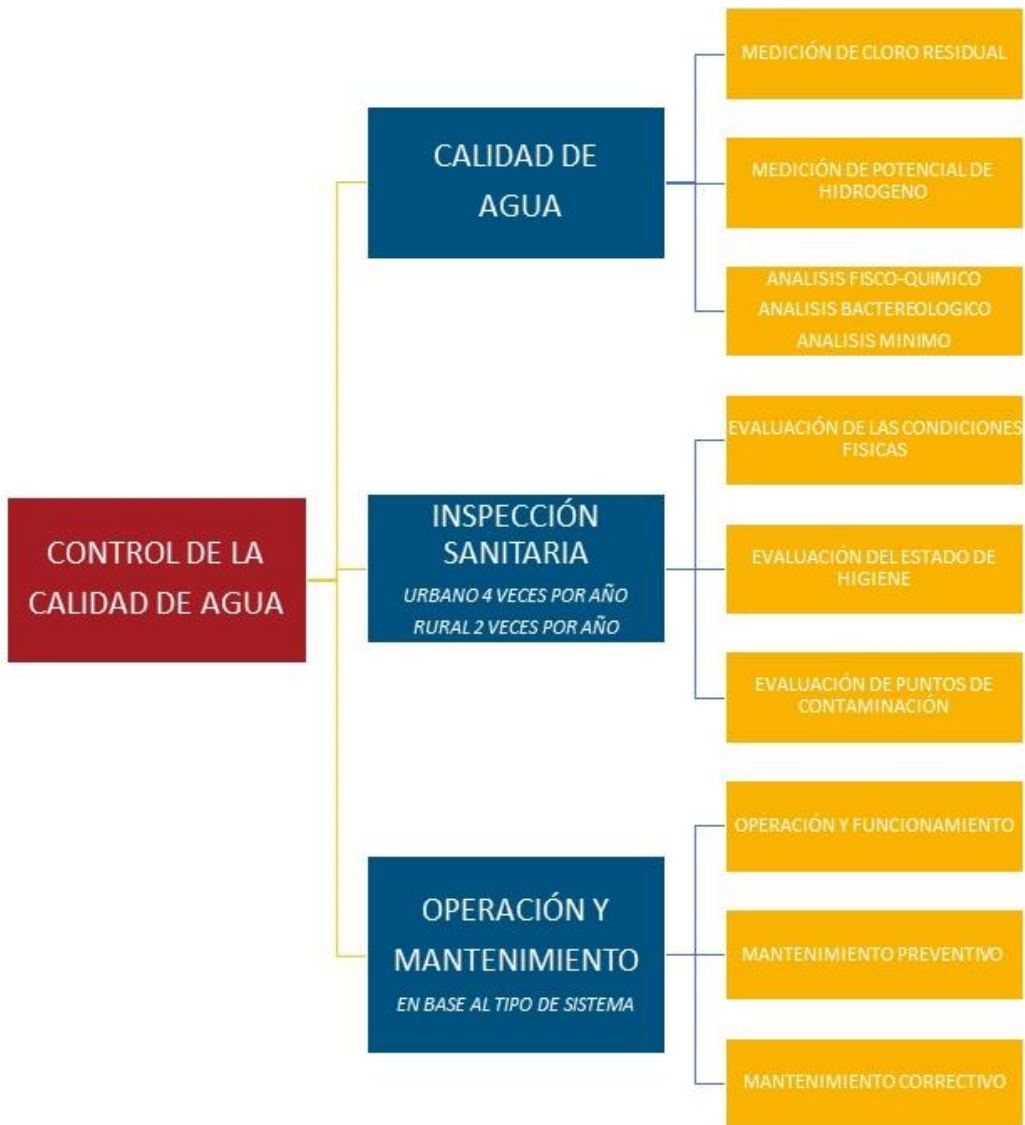

Anexo 1:

Análisis de sostenibilidad técnica:

	Indicador	Unidad	Fuente de verificación	Rango de medición	
1	El sistema en su conjunto funciona correctamente	150 personas	Fotografías de todo el sistema. Se recorrió todo el sistema desde la fuente hasta las viviendas para establecer el criterio de funcionamiento.	0.5	<ul style="list-style-type: none"> - Cerco perimetral -Enterrar tubería. -Captación nueva. -Línea de conducción nueva. - Implementar sistema de desinfección. - Educación y sensibilización del ahorro del agua.
2	El sistema de agua construido funciona al menos 6 horas diarias continuadas para garantizar que el 100% de los usuarios tomados en cuenta en el proyecto se beneficien de agua potable.	24 horas/día	Se verificó en el tanque de distribución que llega el agua del sistema evaluado.	0.5	Existen pocas viviendas que no tienen continuidad de agua
3	El caudal diario es suficiente para abastecer a todos los usuarios, teniendo en cuenta la estacionalidad de las fuentes.	55.3 m ³ /día	Con un total de 25 viviendas en el sistema, 6 habitantes/vivienda, un caudal de 150 l/h/d se tiene un caudal necesario presente de 55.3 m ³ /día presente.	1	Existen pocas viviendas a las que no les llega el agua en época de verano.

4	El caudal que llega a los usuarios es igual o mayor a 50 litros/habitante/día	150 l/habitante/día	El caudal actualmente llega a todos.	1	
5	Se han llevado a cabo capacitaciones técnicas entre las organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua	0	No existen documentos y los representantes comunitarios afirman no haber recibido capacitación	0	- Promover capacitaciones de haciendo énfasis en la conservación de la documentación para transmitir dicha información a cada cambio de comité de mantenimiento local.
6	Existen fontaneros asignados para el mantenimiento y funcionamiento del sistema de agua, cubriendo el 100% del sistema	0	No existe personal a pago fijo encargado del sistema. El comité elegido anualmente se encarga de hacer mantenimiento correctivo.	0	- Implementar la cultura de mantenimiento preventivo por parte del comité de mantenimiento de agua.
7	Se realizan actividades de operación y mantenimiento en base a los planes de Operación y Mantenimiento.	0	El mantenimiento tiene un plan establecido por el comité central de Mantenimiento de agua. Cuentan con un plan de limpieza del tanque del sistema que cumplen a cada cierto período de tiempo, pero no tienen un plan formal e impreso el cual seguir a cabalidad.	0	- Realizar un plan de Operación y mantenimiento formal e impreso que se mantenga en poder de cada comité de agua electo anualmente.
8	Se han elaborado planes de Operación y mantenimiento y	0	No se tienen planes de operación y mantenimiento en poder del comité de	0	- Realizar un plan de Operación y mantenimiento

	están al alcance de todas las personas interesadas o implicadas en el sistema		mantenimiento de agua.		formal e impreso que se mantenga en poder de cada comité de agua electo anualmente.
9	La tecnología implantada y decidida en conjunto con la población beneficiaria es la más asequible y la más apropiada para las condiciones locales estudiadas	1 sistema por gravedad	Se verificó que todo el sistema en conjunto cuenta con elementos convencionales para un sistema por gravedad. Los elementos y accesorios del sistema pueden adquirirse fácilmente por proveedores locales. No existen elementos tecnológicos de difícil manejo o reparación.	1	
10	El sistema de agua se encuentra a una distancia máxima de 500m-30min desde la vivienda al punto donde se toma el agua	25 viviendas	El sistema de distribución tiene acometidas en el 100% de las viviendas beneficiadas por lo que cada vivienda en su interior cuenta con un chorro.	1	
11	Existen suministros, repuestos y servicios disponibles accesibles a la comunidad y es conocida por los responsables del mantenimiento del sistema	El Caserío está ubicado en una zona alejada de la carretera interamericana y dentro de el, no existen ferreterías o ventas de materiales .	La comunidad no tiene acceso a una ferretería y por fuera de la comunidad	0	- Mantener un stock de accesorios para reparación del sistema



12	El prestador de servicios tiene capacidad suficiente y adecuada para disponer de personal en la diferentes actividades de operación y mantenimiento	4 personas	El comité no está organizado para operación y mantenimiento.	0	Implementación de manual de operación y mantenimiento.
13	El prestador de servicios tiene toda la documentación técnica del sistema (planos, diseños etc.) además de manuales y guías de operación y mantenimiento.	0	No tienen información que se haya utilizado para la construcción del sistema.	0	<ul style="list-style-type: none"> - Hacer croquis de sistema. - Crear e implementar manuales de operación y mantenimiento para la comunidad.

Análisis de sostenibilidad ambiental:

	Indicador	Unidad	Fuente de verificación	Rango de medición	
	El agua que se distribuye en los sistemas de agua construidos o mejorados cumple con las normas de calidad de agua del país para su consumo humano COGUANOR 29001	0		0	
	Se hacen análisis de agua mensuales para asegurar que la calidad del agua cumple con lo establecido en las normas de calidad de agua exigidas por el país	0 análisis		0	
	La toma de agua a la que pertenece la fuente de agua esta forestada, cercada y protegida de contaminación (*)	Observación directa	El área no está protegida por cercos y el área alrededor no está forestada.	0	El área de las captaciones no tienen cerco
	Las aguas que entran y que posteriormente conduce el sistema no están contaminadas (Salinización, alteración de las propiedades fisicoquímicas del agua...)	0	No se realizaron análisis fisicoquímicos	0	No se tienen registros del sistema de salud.

Se realizan actividades para mantener las fuentes de agua protegidas y aisladas de posibles contaminaciones	0	Solamente existen actividades de limpieza en fuentes y tanque de almacenamiento.	0	No se realizan actividades específicas dirigidas a evitar contaminaciones indirectas.
Todos los usuarios del sistema de agua al menos han sido capacitados una vez en educación ambiental	0	No existe documentación	0	No ha habido capacitaciones para todos los usuarios.
Existencia de un análisis inicial de riesgos e identificación y puesta en marcha de medidas específicas de reducción del riesgo y en general medidas destinadas a reforzar la permanencia de la infraestructura y la continuidad del servicio. (*)	0	No existe documentación	0	No existe la cultura de mantenimiento preventivo en la comunidad.
Existencia de planes de contingencia donde se establezcan procedimientos operativos para la respuesta conforme a los requisitos de recursos previstos y a la capacidad necesaria para determinados riesgos a nivel	0	No existe plan de contingencia	0	El área no está sujeta de manera cotidiana a eventos naturales que hayan desarrollado el sentido de prevención ante contingencias posibles.



	local, regional o nacional (Ej. desastres naturales y limitaciones de suministro)				
	Existe un plan de manejo de cuencas que se aplica a la cuenca a la que pertenece el sistema de agua	0	No existe documentación	0	La cuenca que abastece los manantiales es comunitaria. Existe de manera empírica el principio de la conservación de la flora y fauna de la cuenca. Hasta ahora este manejo les parece suficiente.

Anexo 2: Presupuesto de mejoras



Presupuesto Integrado

No.	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SUBRENGLON	PRECIO TOTAL SUBRENGLON	PRECIO TOTAL RENGLON	NIVEL DE PRIORIDAD
1	FORTALECIMIENTO A OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE					Q 13,500.00	
1.1	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA	global	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00		CORTO PLAZO
1.2	SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA	global	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00		CORTO PLAZO
1.3	EQUIPAMIENTO A FONTANEROS O ENCARGADOS DE MANTENIMIENTO	global	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00		CORTO PLAZO
1.4	CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CASERÍO CHIRIJSACASIGUAN	global	1	Q 5,500.00	Q 5,500.00		CORTO PLAZO
1.5	SENSIBILIZACIÓN DE AHORRO DE AGUA	global	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00		CORTO PLAZO
2	FORTALECIMIENTO A SISTEMA DE SANEAMIENTO					Q 78,906.61	
2.1	IMPLEMENTACIÓN SANTOLIC PARA LOGRAR COMUNIDAD FIDAL	global	1	Q 7,100.00	Q 7,100.00		CORTO PLAZO
2.2	IMPLEMENTACIÓN DE KIT DE HIGIENE BUCODENTAL Y LAVADO DE MANOS	global	1	Q 11,880.00	Q 11,880.00		CORTO PLAZO
2.3	SENSIBILIZACIÓN PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	global	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00		CORTO PLAZO
2.4	TRAMPA DE GRASA	unidad	25	Q 890.02	Q 22,250.45		LARGO PLAZO
2.5	POZO DE ABSORCIÓN	unidad	25	Q 776.66	Q 19,416.41		LARGO PLAZO
2.6	SUMIDERO	unidad	25	Q 630.39	Q 15,759.75		LARGO PLAZO
3	CAPTACIÓN					Q 27,826.25	
3.1	LIMPIEZA DE CAPTACIONES	global	1	Q 800.00	Q 800.00		CORTO PLAZO
3.2	CERCO PERIMETRAL CAPTACIÓN	global	1	Q 4,253.00	Q 4,253.00		CORTO PLAZO
3.4	ENTERRAR TUBERÍA	global	1	Q 682.25	Q 682.25		CORTO PLAZO
3.5	CAPTACIÓN NUEVA	unidad	1	Q 22,091.00	Q 22,091.00		MEDIANO PLAZO
4	CONDUCCIÓN					Q 107,298.00	
4.1	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	unidad	1	Q 107,298.00	Q 107,298.00		MEDIANO PLAZO
5	TANQUE DE DISTRIBUCIÓN					Q 15,177.71	
5.1	SISTEMA DE DESINFECCIÓN TANQUE	unidad	2	Q 5,204.86	Q 10,409.71		MEDIANO PLAZO
5.2	CERCO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN	global	1	Q 4,768.00	Q 4,768.00		CORTO PLAZO
TOTAL DE MEJORAS A IMPLEMENTAR EN SISTEMA EXISTENTE						Q 242,708.57	

Presupuesto desglosado

PRESUPUESTO DESGLOSADO					
1. FORTALECIMIENTO A OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE					
No.	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.1 IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA					
	Capacitación de uso de plan de operación y mantenimiento	global	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00
	Cronograma anual de mantenimiento	global	1	Q 500.00	Q 500.00
	Entrega de plan de operación y mantenimiento a operadores del sistema	global	1	Q 500.00	Q 500.00
TOTAL MATERIALES					Q 2,000.00
B-TOTAL - 1.1 IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA					Q 2,000.00
1.2 SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA					
	Reuniones de sensibilización con la comunidad	global	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00
	Entrega de plan de control de calidad del agua	global	1.00	Q 500.00	Q 500.00
TOTAL MATERIALES					Q 2,500.00
SUB-TOTAL - 1.2 SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA					Q 2,500.00
1.3 EQUIPAMIENTO A FONTANEROS O ENCARGADOS DE MANTENIMIENTO					
	Kit de herramientas para fontanería	unidad	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
TOTAL MATERIALES					Q 1,500.00
SUB-TOTAL - 1.3 EQUIPAMIENTO A FONTANEROS O ENCARGADOS DE MANTENIMIENTO					Q 1,500.00
1.4 CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CASERÍO CHIRIJSACASIGUAN					
	Taller para fortalecimiento de la organización comunitaria	global	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00
	Establecimiento de requisitos para la conformación de CAS	global	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
	Reunión comunitaria para elección de CAS	global	1.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
TOTAL MATERIALES					Q 5,500.00
TOTAL - 1.4 CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CASERÍO CHIRIJSACASIGUAN					Q 5,500.00

1.5 SENSIBILIZACIÓN DE AHORRO DE AGUA						
	Taller de sensibilización para el ahorro del agua	global	1	Q	2,000.00	Q 2,000.00
TOTAL MATERIALES						Q 2,000.00
SUB-TOTAL - 1.5 SENSIBILIZACIÓN DE AHORRO DE AGUA						Q 2,000.00
2. FORTALECIMIENTO A SISTEMA DE SANEAMIENTO						
No.	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.1 IMPLEMENTACIÓN SANTOLIC PARA LOGRAR COMUNIDAD FIDAL						
	Material didático e insumos para facilitador	global	1	Q	500.00	Q 500.00
	Insumos para la celebración FIDAL	global	1	Q	1,800.00	Q 1,800.00
	Rótulo FIDAL para la comunidad	global	1	Q	1,300.00	Q 1,300.00
	Costo de facilitador	global	1	Q	2,000.00	Q 2,000.00
	Visita de verificación por el comité FIDAL	global	1	Q	1,500.00	Q 1,500.00
TOTAL MATERIALES						Q 7,100.00
SUB-TOTAL - 2.1 IMPLEMENTACIÓN SANTOLIC PARA LOGRAR COMUNIDAD FIDAL						Q 7,100.00
2.2 IMPLEMENTACIÓN DE KIT DE HIGIENE BUCODENTAL Y LAVADO DE MANOS						
	Kit de higiene bucodental	unidad	120	Q	59.00	Q 7,080.00
	Kit de lavado de manos	unidad	120.00	Q	40.00	Q 4,800.00
TOTAL MATERIALES						Q 11,880.00
SUB-TOTAL - 2.2 IMPLEMENTACIÓN DE KIT DE HIGIENE BUCODENTAL Y LAVADO DE MANOS						Q 11,880.00
2.3 SENSIBILIZACIÓN PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS						
	Capacitaciones de manejo de basura	global	1	Q	2,000.00	Q 2,000.00
	Implementación de manual de manejo de basura	global	1.00	Q	500.00	Q 500.00
TOTAL MATERIALES						Q 2,500.00
SUB-TOTAL - 2.3 SENSIBILIZACIÓN PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS						Q 2,500.00

2.4 TRAMPA DE GRASA							
TEE Ø 3" PVC Campana Cementada	Unidad	50	Q	91.30	Q	4,565.00	
Niple PVC Ø 3" PVC 100 PSI 0.40 metros	Unidad	25	Q	17.00	Q	425.00	
Niple PVC Ø 3" PVC 100 PSI 0.20 metros	Unidad	25	Q	8.50	Q	212.50	
Cemento UGC 4000 PSI	saco	39	Q	78.00	Q	3,042.00	
Acero corrugado Ø 3/8 Grado 40 Tipo Original	varilla	75	Q	31.00	Q	2,325.00	
Alambre de Amarre Cal. 16	Lb	25	Q	6.50	Q	162.50	
Clavo Ø 2 1/2"	Lb	8	Q	8.00	Q	64.00	
Block 0.14x0.39x0.19 Normado 35 KG/cm2	Unidad	747	Q	4.35	Q	3,249.45	
Madera para formaleta	Pt	38	Q	5.00	Q	190.00	
Arena Triturada Certificada	M3	2.5	Q	250.00	Q	625.00	
Piedrin Triturado Certificado Ø 3/4"	M3	2.5	Q	300.00	Q	750.00	
Arena Cemida	M3	1	Q	640.00	Q	640.00	
Transporte	Global	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	
TOTAL MATERIALES						Q	17,750.45
Albañil	Dia	25		100.00	Q	Q	2,500.00
Ayudante	Dia	25		80.00	Q	Q	2,000.00
TOTAL DE MANO DE OBRA						Q	4,500.00
SUB-TOTAL - 2.4 TRAMPA DE GRASA						Q	22,250.45
2.5 POZO DE ABSORCIÓN							
Cemento UGC 4000 PSI	saco	28	Q	78.00	Q	2,184.00	
Acero corrugado Ø 3/8 Grado 40 Tipo Original	varilla	66	Q	31.00	Q	2,046.00	
Acero liso Ø 1/4 Grado 40 Tipo Original	varilla	23	Q	9.67	Q	222.41	
Alambre de Amarre Cal. 16	Lb	22	Q	6.50	Q	143.00	
Clavo Ø 3"	Lb	17	Q	8.00	Q	136.00	
Tubo de cemento Ø 36"	Unidad	25	Q	340.00	Q	8,500.00	
Piedrin Triturado Certificado Ø 3/4"	M3	2.5	Q	300.00	Q	750.00	
Arena Triturada Certificada	M3	2	Q	250.00	Q	500.00	
Madera para formaleta	Pt	87	Q	5.00	Q	435.00	
						Q	-
TOTAL MATERIALES						Q	14,916.41
Albañil	Dia	25		100.00	Q	Q	2,500.00
Ayudante	Dia	25		80.00	Q	Q	2,000.00
TOTAL DE MANO DE OBRA						Q	4,500.00
SUB-TOTAL - 2.5 POZO DE ABSORCIÓN						Q	19,416.41

2.6 SUMIDERO					
Tubería Naranja Ø 3" PVC 80 PSI	Tubo	13	Q 205.00	Q 2,665.00	
Codo 90° Ø 3" PVC Campana Cementada	Unidad	50	Q 83.60	Q 4,180.00	
Wype	Lb	1	Q 14.50	Q 14.50	
Cemento Solvente para PVC 1/4 Gal.	Unidad	4	Q 152.75	Q 611.00	
Cemento UGC 4000 PSI	saco	12	Q 78.00	Q 936.00	
Arena Triturada Certificada	M3	1	Q 250.00	Q 250.00	
Piedrin Triturado Certificado Ø 3/4"	M3	1	Q 300.00	Q 300.00	
Acero liso Ø 1/4 Grado 40 Tipo Original	varilla	75	Q 9.67	Q 725.25	
Alambre de Amarre Cal. 16	Lb	12	Q 6.50	Q 78.00	
Transporte	Global	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
				Q -	
TOTAL MATERIALES				Q 11,259.75	
Albañil	Día	25	100.00 Q	Q 2,500.00	
Ayudante	Día	25	80.00 Q	Q 2,000.00	
TOTAL DE MANO DE OBRA				Q 4,500.00	
SUB-TOTAL - 2.6 SUMIDERO				Q 15,759.75	
3. CAPTACIÓN 1					
3.1 LIMPIEZA DE CAPTACIONES					
TOTAL MATERIALES				Q -	
Mano de obra	global	1	800.00 Q	Q 800.00	
SUB-TOTAL - 3.1 LIMPIEZA DE CAPTACIONES				Q 800.00	
3.2 CERCO PERIMETRAL CAPTACIÓN					
Parales de 3"*3"*2m	unidad	86	Q 25.00	Q 2,150.00	
Lañas	caja	12	Q 10.00	Q 120.00	
Alambre Espigado	rollo	3	Q 400.00	Q 1,200.00	
Candado Yale de 40mm	unidad	2	Q 60.00	Q 120.00	
Clavo para madera de 3"	libra	2	Q 9.00	Q 18.00	
TOTAL MATERIALES				Q 3,608.00	
Mano de obra	global	1	645.00 Q	Q 645.00	
SUB-TOTAL - 3.2 CERCO PERIMETRAL CAPTACIÓN				Q 4,253.00	

3.3 ENTERRAR TUBERIA						
	Pegamento de pvc	Galón	1	Q	462.00	Q 462.00
	Lija	unidad	1	Q	15.00	Q 5.25
						Q -
TOTAL MATERIALES						Q 467.25
	Mano de obra	global	1		215.00 Q	Q 215.00
SUB-TOTAL - 3.3 ENTERRAR TUBERIA						Q 682.25
3.4 CAPTACIÓN NUEVA						
	Cemento UGC 4000 PSI	saco	50	Q	78.00	Q 3,900.00
	Aceros corrugado Ø 3/8 Grado 40 Tipo Original	varilla	39	Q	30.00	Q 1,170.00
	Alambre de Amarre Cal. 16	Lb	14	Q	5.50	Q 77.00
	Clavo Ø 2 1/2"	Lb	19	Q	6.50	Q 123.50
	Madera para formaleta	Pt	188	Q	5.00	Q 940.00
	Arena triturada certificada	m3	5	Q	235.00	Q 1,175.00
	Piedrin Triturado Certificado Ø 3/4"	m3	5	Q	315.00	Q 1,575.00
	Piedra bola 2 1/2"-3"	m3	6	Q	225.00	Q 1,350.00
	Piedra bola 6"-10" (filtro captacion)	M3	6	Q	225.00	Q 1,350.00
	Grava Ø 3" (filtro captacion)	M3	2.6	Q	315.00	Q 819.00
	Grava Ø 1/2" (filtro captacion)	M3	5	Q	315.00	Q 1,575.00
	Tubo Ø 2" PVC 160 PSI	Unidad	1	Q	182.00	Q 182.00
	Tubo Ø 1" PVC 160 PSI	Unidad	1	Q	71.00	Q 71.00
	Pichacha PVC de 2"	Unidad	1	Q	4.00	Q 4.00
	Pichacha PVC de 1"	Unidad	1	Q	2.00	Q 2.00
	Tapon hembra Ø 1" PVC	Unidad	1	Q	4.10	Q 4.10
	Adaptador macho Ø 2" PVC	Unidad	2	Q	11.00	Q 22.00
	Adaptador macho Ø 1" PVC	Unidad	2	Q	5.60	Q 11.20
	Codo 90º Ø 1" PVC Campana Cementada	Unidad	4	Q	15.90	Q 63.60
	Tee Ø 1" PVC Campana Cementada	Unidad	1	Q	22.10	Q 22.10
	Valvula compuerta Ø 2" Br. 200 Lbs/Pulg2 WOG	Unidad	1	Q	280.00	Q 280.00
	Valvula compuerta Ø 1" Br. 200 Lbs/Pulg2 WOG	Unidad	1	Q	120.00	Q 120.00
	Aceros corrugado Ø 1/2 Grado 40 Tipo Original	varilla	1	Q	54.50	Q 54.50
	Niple HG Ø 2" 1mt con rejilla	Unidad	1	Q	60.00	Q 60.00
	Cemento Solvente para PVC 1/16 Gal.	Unidad	1	Q	60.00	Q 60.00
	Candado acerado 60 mm	Unidad	4	Q	120.00	Q 480.00
	Transporte	Unidad	1	Q	1,500.00	Q 1,500.00
TOTAL MATERIALES						Q 16,991.00
	Mano de obra	global	1		5,100.00 Q	Q 5,100.00
SUB-TOTAL - 3.4 CAPTACIÓN NUEVA						Q 22,091.00




4. CONDUCCIÓN						
No.	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
LINEA DE CONDUCCIÓN						
	Tubo de 2" pvc 160 psi	Unidad	525	Q 182.00	Q	95,550.00
	Pegamento	Unidad	4	Q 462.00	Q	1,848.00
	Transporte	Global	1	Q 1,500.00	Q	1,500.00
					Q	-
					Q	-
TOTAL MATERIALES					Q	98,898.00
	Mano de obra	global	525	16.00 Q	Q	8,400.00
SUB-TOTAL - LINEA DE CONDUCCIÓN					Q	107,298.00
5. TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 1						
No.	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
5.1 SISTEMA DE DESINFECCIÓN TANQUE						
	Concreto 3000 psi	m3	2	1,250.00 Q	Q	2,500.00
	Clavo para madera de 2½"	Libra	2	8.40 Q	Q	16.80
	Alambre de Amarre calibre 16	Libra	2	8.40 Q	Q	16.80
	Varilla de Hierro Grado 40 de 3/8"	Varilla	15	33.17 Q	Q	497.55
	Clorador artesanal de 4"	Unidad	2	450.00 Q	Q	900.00
	Tee PVC Lisa de 1"	unidad	2	6.50 Q	Q	13.00
	Tee PVC Lisa de ½"	unidad	2	3.73 Q	Q	7.46
	Válvula de Globo ½" URREA	unidad	2	127.40 Q	Q	254.80
	Llave de Chorro C/Rosca PVC de ½"	unidad	4	37.40 Q	Q	149.60
	Adaptador PVC Macho de ½"	unidad	6	3.23 Q	Q	19.38
	Adaptador PVC Hembra de ½"	unidad	4	3.96 Q	Q	15.84
	Tapadera metalica de 0.60 X 0.60 X 1/8"	unidad	2	752.40 Q	Q	1,504.80
	Candado Yale de 40 mm	unidad	2	57.40 Q	Q	114.80
	Reducidor Bushing PVC Liso de 1 1/2" a ½"	unidad	4	6.50 Q	Q	26.00
	Tubo PVC de ½" *20' C/315 PSI	unidad	10	21.78 Q	Q	217.80
	Pegamento PVC Tangit Pomo de 25 gr.	pomo	2	27.40 Q	Q	54.80
	Codo de 90 Grados PVC Liso de ½"	unidad	12	3.47 Q	Q	41.64
	Codo de 45 Grados PVC Liso de ½"	unidad	8	5.38 Q	Q	43.04
	kit para determinar cloro libre HAC 2231-02	unidad	2	700.00 Q	Q	1,400.00
	Niple Hg con rosca 1/2"X0.20	unidad	4	8.90 Q	Q	35.60
TOTAL MATERIALES					Q	7,829.71
	Mano de obra calificada	global	2	1,290.00 Q	Q	2,580.00
SUB-TOTAL - 5.1 SISTEMA DE DESINFECCIÓN TANQUE					Q	10,409.71
						59




5.2 CERCO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN							
	Parales de 3"*3"*2m	unidad	72	Q	25.00	Q	1,800.00
	Lañas	caja	14	Q	10.00	Q	140.00
	Alambre Espigado	rollo	3.5	Q	400.00	Q	1,400.00
	Candado Yale de 40mm	unidad	2	Q	60.00	Q	120.00
	Clavo para madera de 3"	libra	2	Q	9.00	Q	18.00
TOTAL MATERIALES						Q	3,478.00
	Mano de obra	global	2		645.00 Q	Q	1,290.00
SUB-TOTAL - 5.2 CERCO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN						Q	4,768.00


ANEXO 3: PLANOS

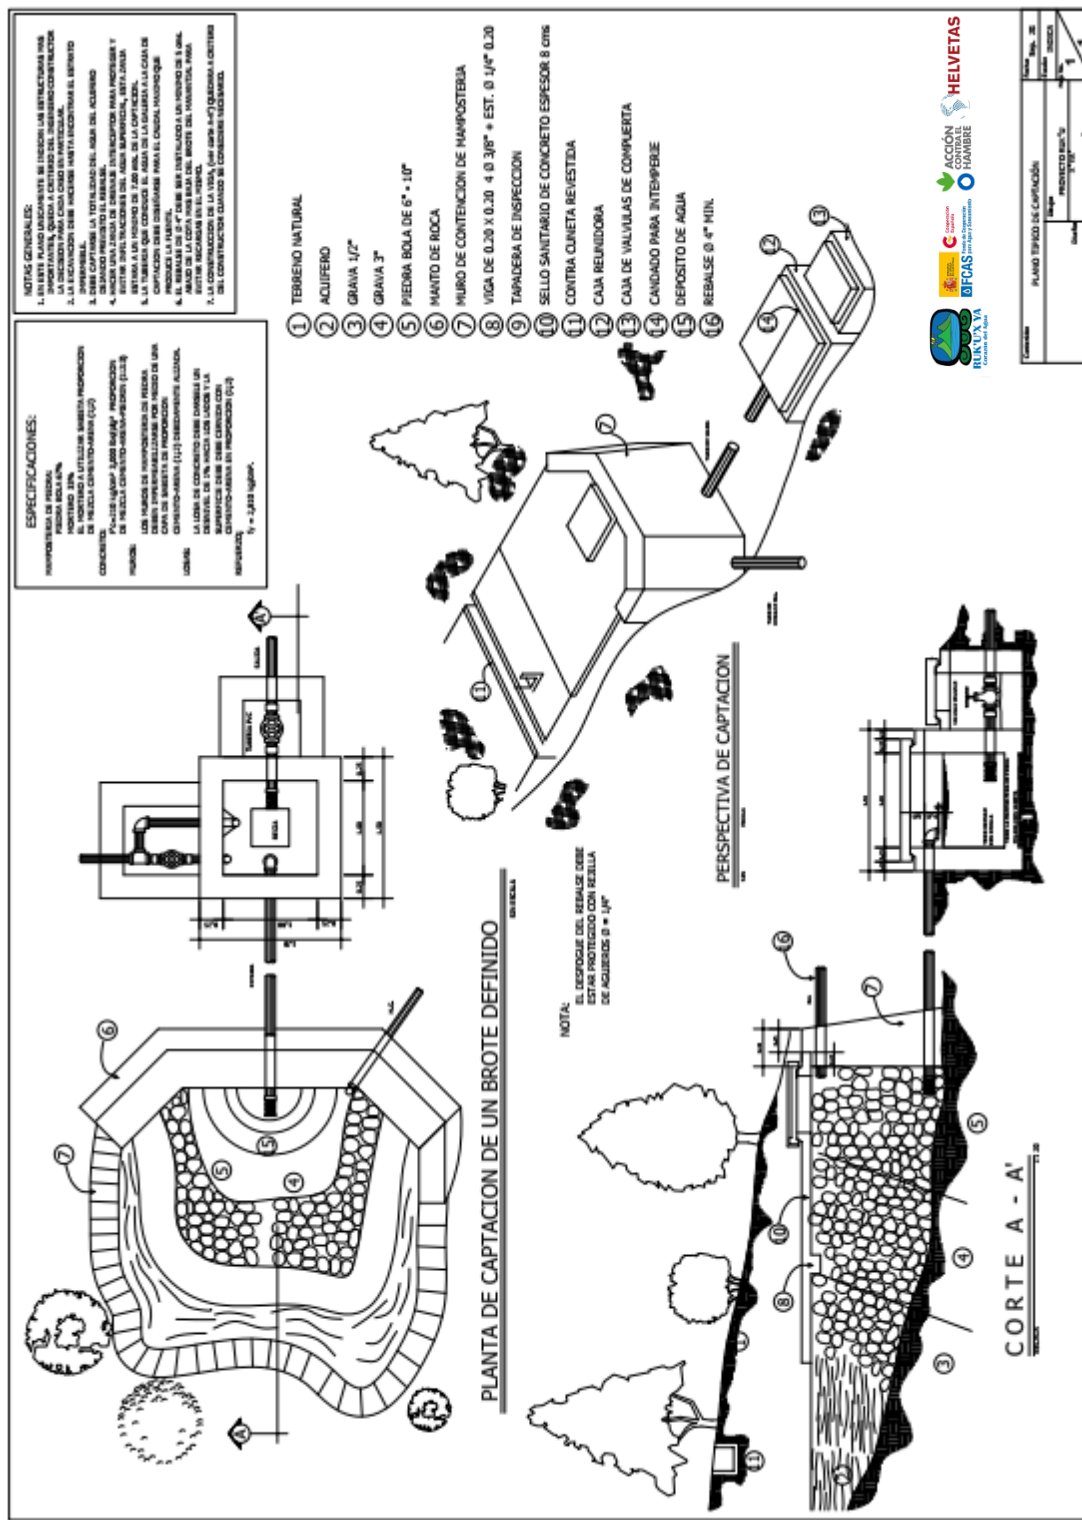

Fecha:	Sept. 2021
Escala:	INDICADA
Hoja No.:	3
Comandante:	PLANO DE DETALLE DE HIPOCLORADOR
Dibujante:	PROYECTO RUK'UX YA'
Diseño:	PROYECTO RUK'UX YA'

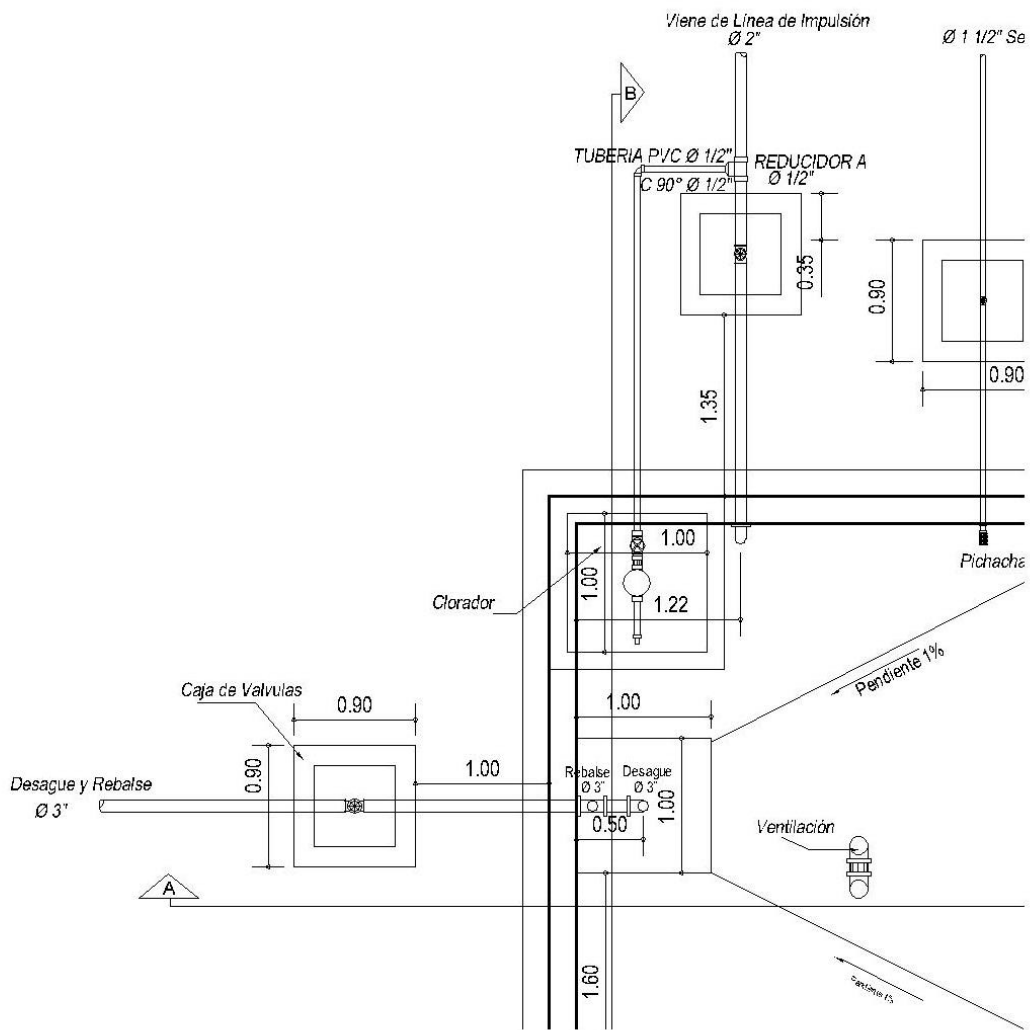


PLANTA DETALLE DE CLORADOR

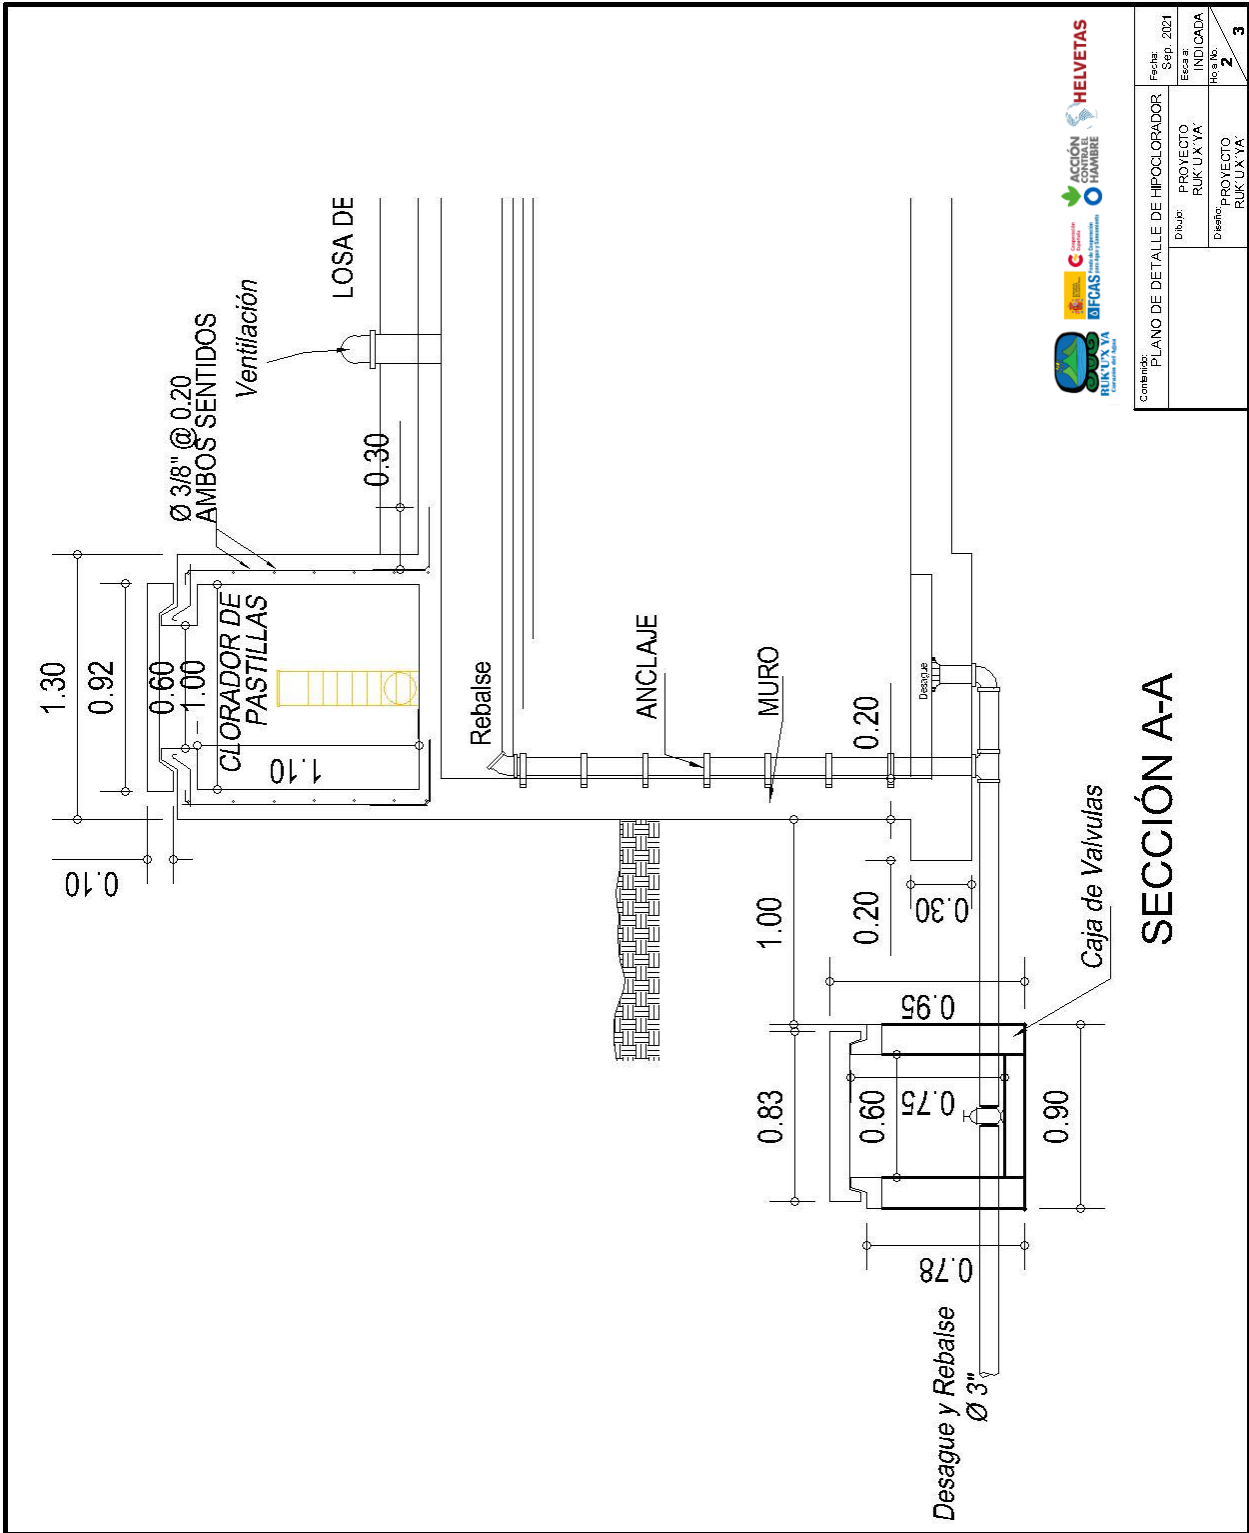



Combinado:	PLANO DE DETALLE DE HIPOCLORADOR	Fecha:	Sep. 2021
Dibujo:	PROYECTO RUK'UX YA'	Escala:	INDICADA
Diseño:	PROYECTO RUK'UX YA'	Hoja No.:	2
			3



SECCIÓN A-A

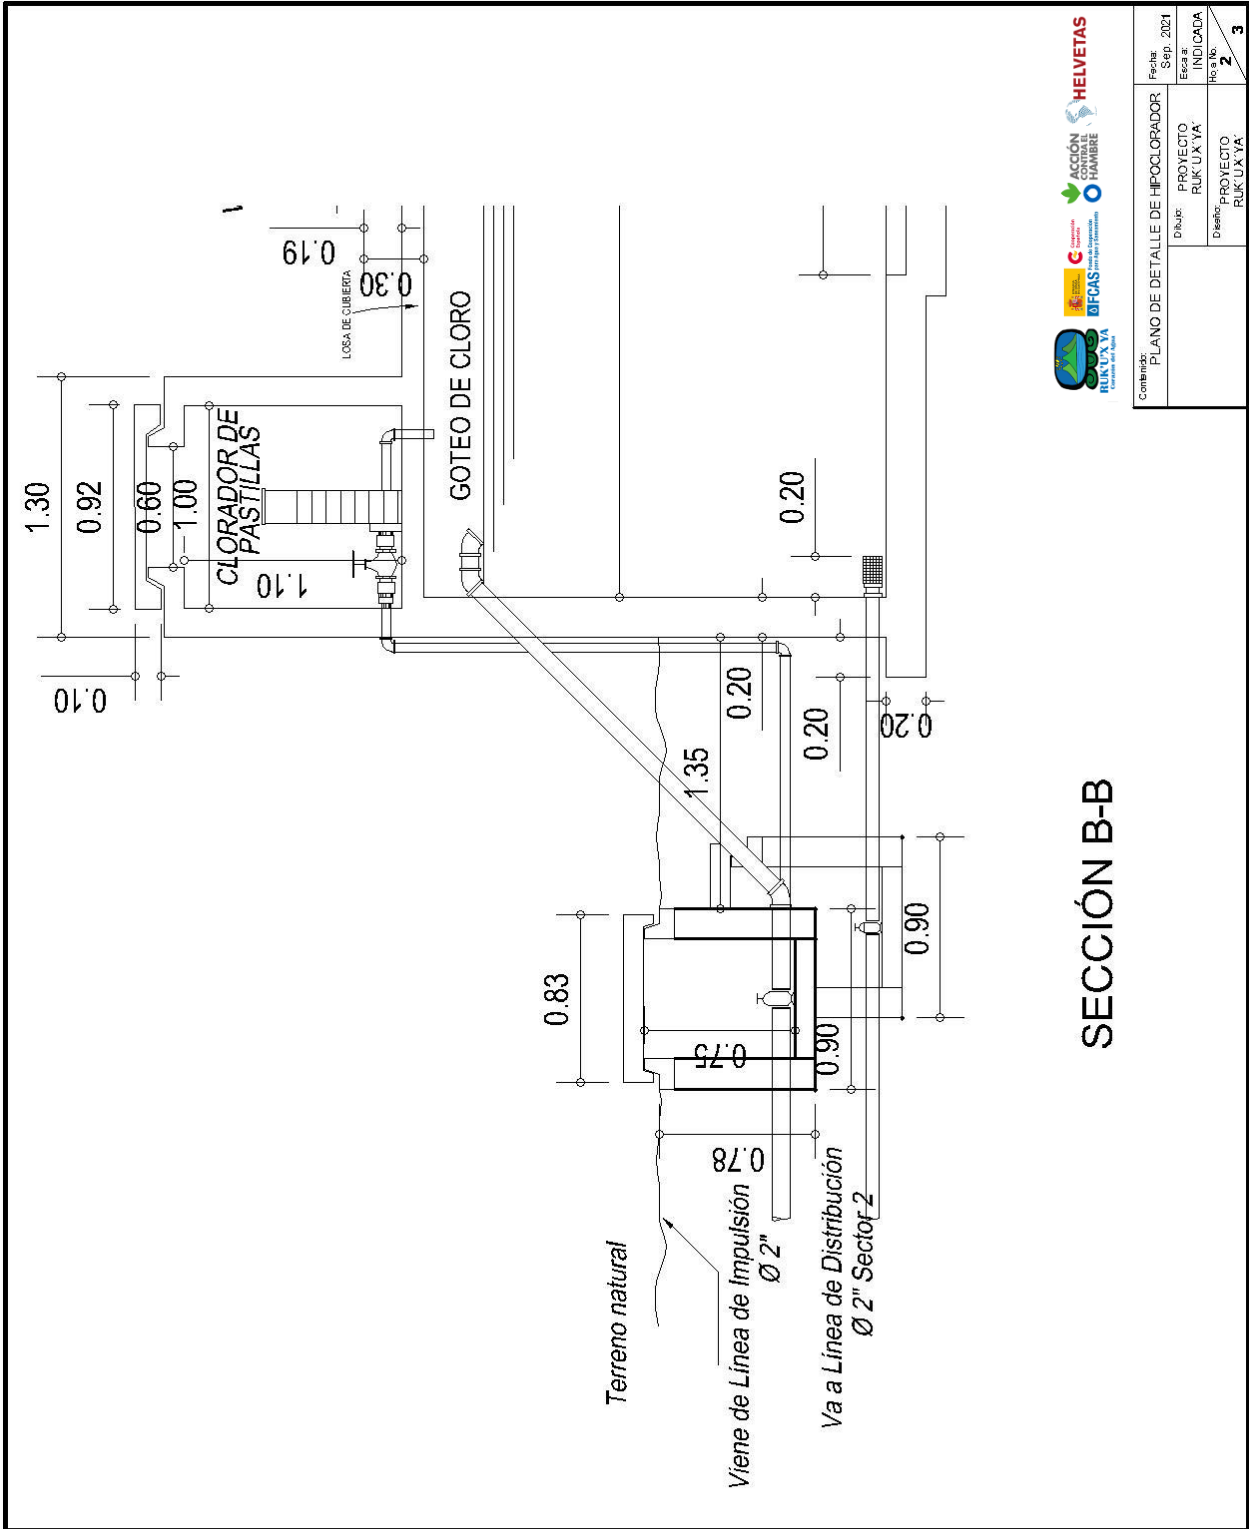

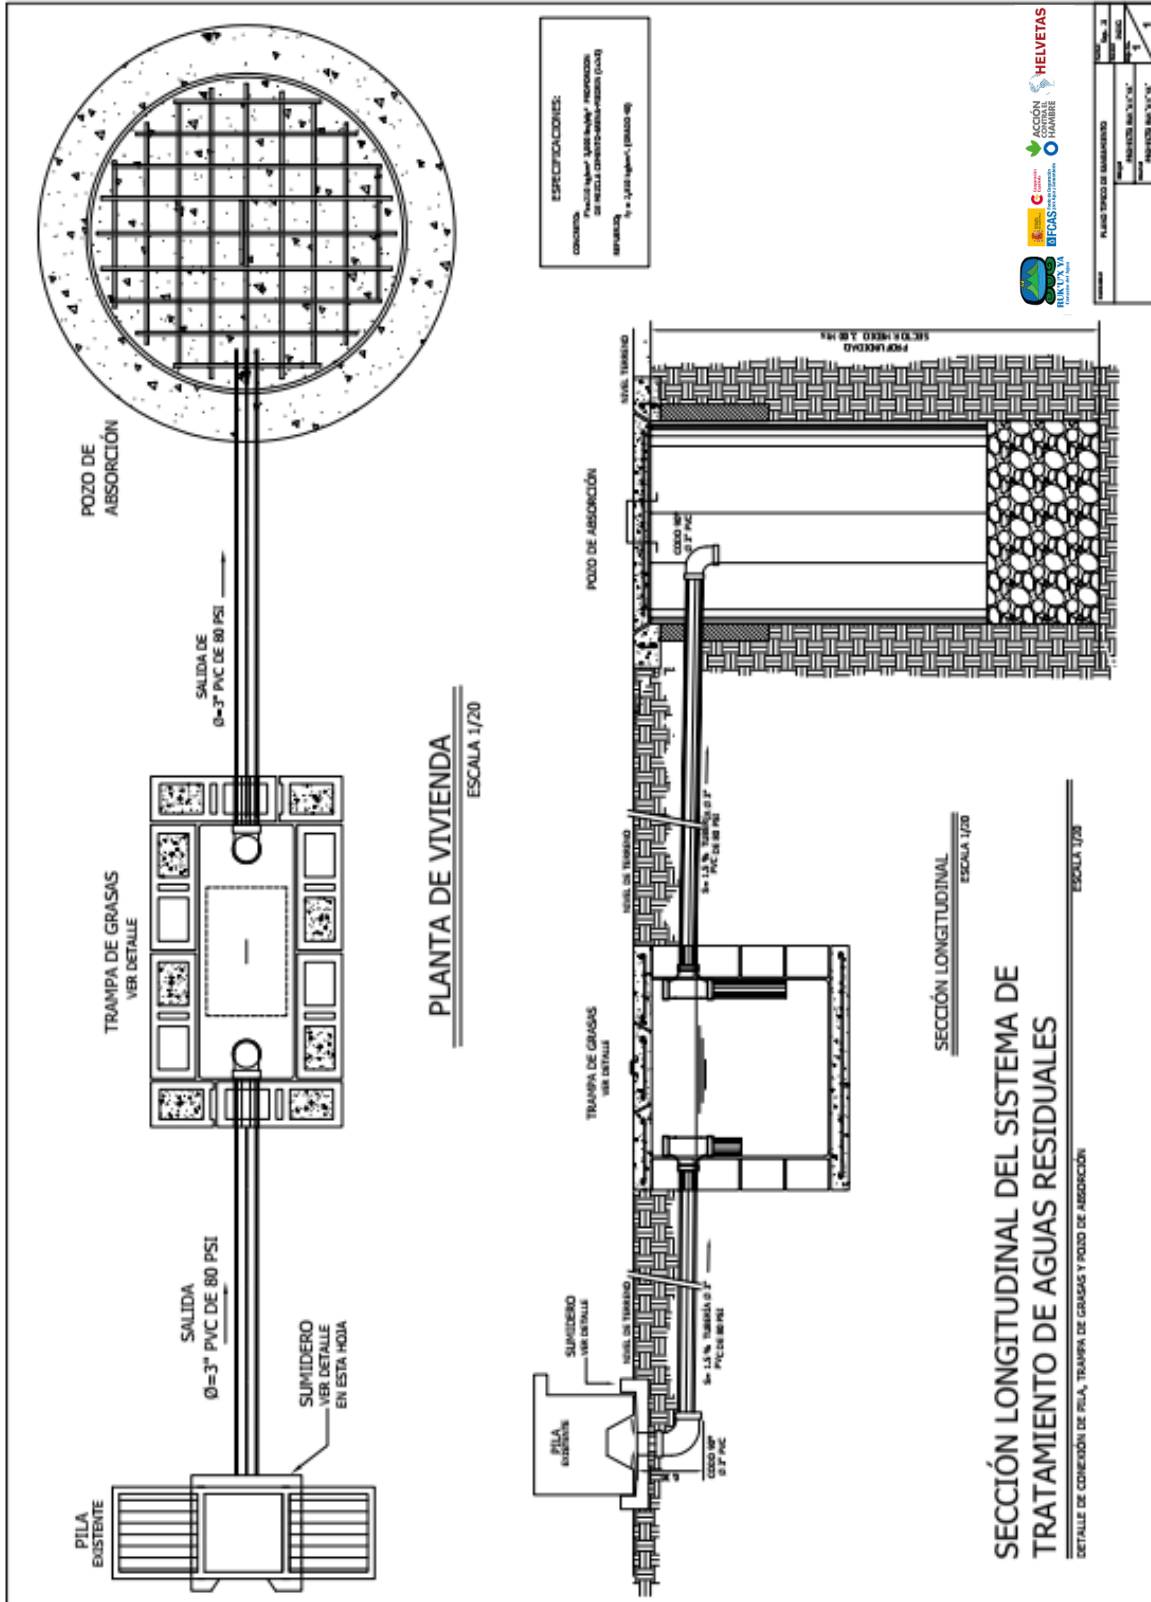

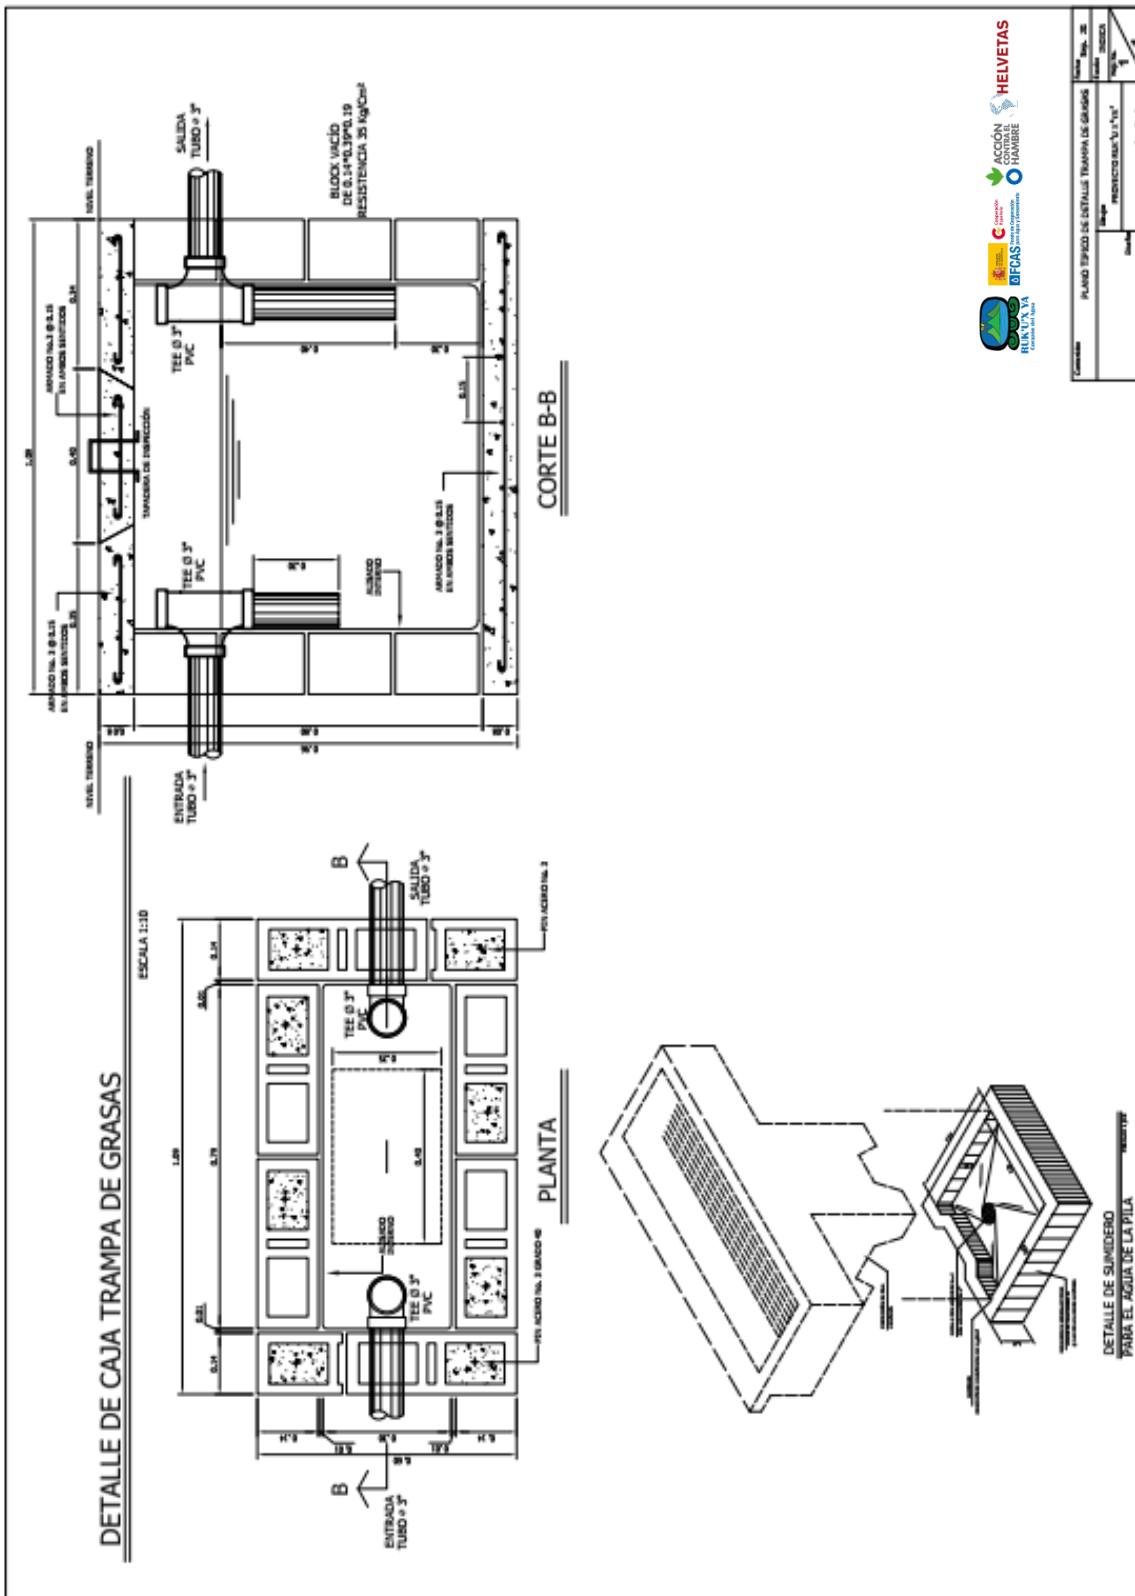



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERALIDADES

Objeto de las especificaciones técnicas

El objeto de las especificaciones técnicas, es definir y regir la construcción de las distintas obras, que conforman el plan de mejoras; que deberán ejecutarse de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato.

Serán de carácter complementario y todo lo que se designe o especifique en cualquiera de ellos será como si se hiciera en ambos. Se procederá de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas.

SUJECCIÓN A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS

El plan de mejoras de agua y saneamiento básico se construirá de conformidad con las especificaciones técnicas de construcción y planos elaborados. El ejecutor no podrá variar las especificaciones técnicas sin previa autorización por escrito de la comunidad o de una persona experta en el ramo.

Otros documentos que son importantes para la debida construcción del plan son:

Estudio técnico

Planos del proyecto

Contrato

Normas de construcción de INFOM-UNEPAR

LINEAMIENTOS GENERALES

Los trabajos que no sean descritos en estas especificaciones generales, deberán realizarse de acuerdo a las mejores prácticas de ingeniería civil, sanitaria, eléctrica; mecánica e hidráulica, requeridas por la obra.

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD

Se protegerá toda propiedad pública o privada contra daños, que pueda ser afectada en el proceso de transporte de materiales para la construcción del plan de mejoras de agua y saneamiento básico.

Los trabajos que se tengan que realizar y que se encuentren cerca de propiedades, servicios privados, teléfonos, líneas de conducción eléctrica, carretera etc., se harán con todas las precauciones necesarias.

Si existiera el caso de indemnizaciones por daños ocasionados éstas correrán por cuenta de la comunidad.

Deberá cubrir subsanación de errores o fallos ocultos que se pongan de manifiesto o se descubran mediante pruebas cualesquiera y otros medios.



Los productos originados como consecuencia de la subsanación de fallos deberán cumplir con todos los requerimientos y especificaciones contenidas en este documento.

NORMAS DE SEGURIDAD

Será obligación aplicar todas las disposiciones de seguridad de los reglamentos y las regulaciones sobre seguridad industrial que se encuentren vigentes en el país, tomando las precauciones necesarias con las personas y propiedades.

Se deberá cumplir con las leyes, reglamentos y normas que indica Código de trabajo.

La comunidad deberá velar por el cumplimiento de las medidas de mitigación establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental en la etapa de construcción.

TRÁMITES Y PERMISOS

Se realizarán todos los trámites y permisos ante los organismos nacionales, departamentales y/o municipales que pudieren tener jurisdicción, de ser necesario de acuerdo a la legislación vigente.

El pago de derechos, tasas, contribuciones y otros gastos que pudieren corresponder por estos trámites, serán por cuenta y cargo de la comunidad.

PRUEBAS Y OTROS RENGLONES

Se puede solicitar una copia de las constancias o certificados de garantías de los materiales, tuberías, equipos y componentes sujetos a reclamo de garantía.

Aquellos materiales que no cumplan con las especificaciones o que no reúnan las condiciones estipuladas serán rechazados de inmediato y no serán utilizados.

LIMPIEZA FINAL

Se deberá completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la inspección referida a la recepción provisoria de la obra.

Limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación o el uso de obras temporales.

Eliminará todo rastro de morteros y demolerá las canchas de preparación de mezclas que pudiera haber utilizado, restituyendo la tierra a su estado original.

Retirá de la obra los desechos, material sobrante, basura y construcción.

RESPECTO A LOS PROYECTOS

Los proyectos de agua de agua y saneamiento se construyen de forma integral para reducir el riesgo del padecimiento de enfermedades de origen fecal – oral por los beneficiarios.

Las obras que se describen y especifican en este documento están acordes con las normas de diseño y especificaciones de construcción que tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto de Fomento Municipal y otras instituciones que se dedican a la distribución de agua para consumo humano a nivel rural.

En este documento se utilizarán las abreviaturas siguientes:



PVC: Cloruro de Polivinilo Rígido

HG: Hierro Galvanizado

ASTM: American Standard for Testing of Materials

CS: California Standard

NSF: national Sanitation Foundation

ASPT: American Standard for Piping Test.

RENGLONES DE TRABAJO A CONSIDERAR

LIMPIA, CHAMPEO Y DESTRONQUE

Este renglón comprende los trabajos de limpieza y destronque de los predios donde hayan existentes o se construyan: captaciones, tanques de distribución, líneas de conducción y redes de distribución. Acciones que se deberán realizar antes de iniciar los trabajos de construcción.

CAPTACIÓN (NACIMIENTO)

Con la finalidad de poder mejorar las condiciones bacteriológicas del agua se efectuarán captaciones con sello sanitario de tipo brote definido. Ver planos típicos.

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

Se denominará línea de conducción a la instalación de distintas longitudes y clases de tubería desde los nacimientos hasta el tanque de distribución, con objetivo de conducir el agua a utilizar para consumo humano desde la fuente, hasta el tanque de almacenamiento y distribución.

VÁLVULAS DE LIMPIEZA

Con la finalidad de poder evacuar sedimentos que pueden acumularse dentro de la tubería se ha considerado la instalación de válvulas de limpieza, las cuales serán de bronce y estarán protegidas con caja de concreto, se instalarán en las estaciones indicadas en los planos, principalmente donde hay vértices invertidos o depresiones profundas. Las válvulas de limpieza serán de 1" de diámetro.

CAJA ROMPE PRESIÓN (con y sin válvula de flote)

Con el propósito de regular presiones hidráulicas estáticas, en las líneas de conducción y distribución, se construirán cajas rompe presión de un metro cúbico, las cuales se ubicarán en las estaciones indicadas en los planos y para mayores detalles consultar el plano típico específico. La colocación y uso de la válvula de flote, en una caja rompe presión, dependerá principalmente de su ubicación o de la posibilidad de perder caudal en las horas cuando no hay consumo. Las que se ubican entre la captación y el tanque, en la línea de conducción, normalmente no llevan válvula de flote. Las que se ubican después del tanque de distribución, normalmente si llevan válvula de flote.

PASOS AÉREOS

Para librar algunas irregularidades del terreno o atravesar arroyos, ríos o depresiones pronunciadas, los pasos aéreos utilizan tubería de hierro galvanizado (HG), por estar expuestas al medio ambiente, del mismo diámetro con que viene la línea de conducción o distribución de agua. Dicha tubería está sostenida por cables de acero longitudinales y transversales, fijadas por



mordazas a lo largo de su longitud; apoyadas por columnas con zapatas para su estabilidad, tal como se muestra en los planos típicos correspondientes.

PASOS DE ZANJÓN

Para librar pequeñas irregularidades del terreno o atravesar arroyos, ríos o pequeñas depresiones del terreno. Los cuales utilizan tubería de hierro galvanizado (HG), por estar expuestas al medio ambiente; del mismo diámetro de la tubería que conduce o distribuye el agua, en toda la longitud del paso de zanjón. Por las dimensiones del paso de zanjón, usualmente sólo se apoya la tubería con anclajes de concreto o mampostería.

RED DE DISTRIBUCIÓN

Está integrada por las tuberías que salen del tanque de distribución y que distribuyen el agua a las viviendas de los beneficiarios y para este proyecto son conexiones domiciliarias.

Estas para su ejecución se componen de:

Instalación de tubería: estas en su mayoría serán de PVC y estarán a una profundidad de 1.00 metro, o la que se indique en el detalle de zanja en los planos y con excavación de zanjas de 0.60 metros de ancho para la instalación y después de probada la tubería se tendrá que rellenar con el material extraído. En casos de suelos duros, se harán hasta 0.80 metros y en suelos de piedra se revestirá con mampostería de piedra. La máxima presión estática en la red de distribución debe ser de 60 metros columna de agua.

Válvulas de compuerta: son útiles para aislar ramales durante el proceso de mantenimiento, reparación de fugas o instalación de nuevas conexiones domiciliarias.

Cajas de válvulas: Esta estructura servirá para la protección de la válvula de compuerta y para las válvulas reguladoras de presión. Se hará de concreto armado con un espesor de 0.08 metros, la losa y tapadera de concreto reforzado. La válvula será de bronce, adaptada para tubería y accesorios de PVC. Esta obra se colocará siempre y cuando el diseño hidráulico lo indique.

VÁLVULA DE COMPUERTA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN

Salvo indicación de otro tipo en los planos o en bases especiales. Las válvulas de compuerta de hasta 4" serán de bronce, vástago ascendente, disco de cuña sencillo o doble y para una presión de 160 libras/pulg², excepto que se indique otra presión en los planos.

CLORADOR DE PASTILLAS

En vista de que el caudal a ingresar en el tanque es menor a 8 Lts/seg y por la facilidad en la operación del mismo, la desinfección del agua se realizará utilizando pastillas de hipoclorito de calcio de 65% al 90%, para lo cual se hará una conexión con la tubería de conducción antes de la entrada al tanque. La derivación permite la entrada de agua al dispositivo de pastillas en donde por medio de la abrasión causada por la velocidad del agua en las pastillas se desarrolla el efecto de cloración. Se deberán graduar las llaves del clorador para evitar dosificaciones mayores de 0.50 miligramos por litro. El dispositivo de pastillas deberá estar protegido por medio de una caja de concreto reforzado según se especifica en planos. Para garantizar que se está dosificando la



cantidad adecuada, el operador deberá comprobar la concentración de cloro libre en la red en la parte más lejana y en la parte más alta y el resultado deberá ser de 0.50 miligramos por litro. Si el dato resultare ser menor, deberá abrir más la válvula del clorador y si resultare ser mayor, deberá cerrarla más. Esta acción la debe repetir hasta lograr la dosificación deseada.

La caja será de concreto reforzado con varillas No. 3 grado 40 a una separación de 20 cm. Con espesores de pared de 0.10 m.

TANQUE DE DISTRIBUCIÓN

El tanque de distribución es un depósito de concreto que se utiliza para cubrir la demanda de agua en las horas de mayor consumo, teniendo como objetivo almacenar agua en las horas de menor consumo. El volumen del mismo es un porcentaje alrededor del 30% del caudal medio diario.

CERCO PERIMETRAL

Todos los predios donde existan estructuras pertenecientes al sistema de agua deberán ser circulados con un cerco perimetral, el cual se construirá con parales de madera, separados a una distancia de 1.50 metros, con cinco hiladas de alambre espigado.

Dejando del mismo material una puerta que permita el acceso al predio.

LETRINA

Estructuras utilizadas para la disposición sanitaria de las excretas (heces y orina) y está integrada por los componentes siguientes:

TAZA DE LETRINA

Esta deberá ser prefabricada, deberá contar con una tapadera y un adaptador para que los niños y niñas puedan hacer uso de la letrina.

LOSA O PLANCHA DE LETRINA

Estructura de soporte de la taza de la letrina y con capacidad para soportar a la persona que hará uso de la letrina. Es de concreto reforzado y las dimensiones y refuerzo se indican en los planos correspondientes.

CASETA DE LA LETRINA

Tiene una estructura de madera utilizada para soportar las paredes de la caseta y techo de la misma. Las paredes son de material prefabricado de fibrocemento. El techo debe ser de lámina de zinc calibre 28. Las dimensiones de la caseta, de las paredes, techo y estructura están dadas en los planos correspondientes.

BROCAL DEL POZO

Estructura que sirve de protección al pozo para evitar la infiltración de agua de escorrentía al pozo y de soporte para la losa de piso de la taza. Su estructura es de concreto ciclópeo. Para ello se debe consultar el plano correspondiente.

AGUJERO DE LA LETRINA



Obra destinada para la disposición final de las heces y orina de las personas que integran una familia. Las dimensiones del agujero están indicadas en el plano correspondiente. El periodo de vida útil de la letrina se estima en 5 años.

TUBO DE VENTILACIÓN

Es la mitad de un tubo PVC clase 80 PSI de 3 pulgadas de diámetro con cedazo mosquitero en la parte superior del mismo. Se coloca en una esquina posterior o trasera de la letrina y debe ir anclado a la caseta. Para evitar el ingreso de agua a la fosa, en la parte superior del tubo se colocará un codo de 90 grados y cedazo mosquitero.

SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA VIVIENDA

POZO DE ABSORCIÓN

Estructura destinada para la infiltración del agua residual en el subsuelo. Se puede construir de un ancho de 1.00 metro con un lecho de grava en el fondo y en las paredes, se debe consultar plano típico. El diámetro y profundidad del pozo dependen de la capacidad de absorción del suelo. Previo a la construcción, se recomienda que se realice la prueba de infiltración en cada vivienda para determinar la profundidad real del pozo.

EJECUCIÓN

LIMPIA, CHAPEO Y DESMONTE

La línea para instalación de la tubería deberá ser inicialmente limpiada de troncos, árboles, vegetación viva o muerta, en un ancho mínimo de 0.60 metros; 0.30 metros a cada lado del eje de instalación de la tubería.

Se pueden preservar árboles u otro tipo de vegetación dentro del área de limpieza.

Todo el material resultante de la limpieza, chapeo y desmonte, deberá ser conveniente dispuesto donde no se ocasione daño a las propiedades vecinas.

OBRAS PERMANENTES

Son todos los trabajos necesarios para materializar la infraestructura solicitada en estos documentos y toda obra adicional que, de acuerdo a la buena práctica de ingeniería, pueda mejorar el buen funcionamiento y la durabilidad del proyecto, esté solicitada o no en estos documentos. Entre los renglones de obras necesarias a considerar están:

Colocación e instalación de tubería, válvulas y accesorios, (fabricación de anclajes y cajas de válvulas).

Pruebas de presión.

Cubrimiento de tubería y relleno de zanja.

Otras obras (reposición de cualquier otra estructura que haya sido demolida temporalmente para instalar la tubería).



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA

Este comprende todo trabajo de instalación de tuberías de agua y que no esté en otra sección de estas especificaciones.

Trabajo incluido:

Generalidades

Limpia, chapeo y desmonte

Zanjeo

Soportes para tuberías

Instalación de tubería de PVC

Prueba de tuberías

Relleno de zanjas

Lavado y desinfección interior de la tubería

Materiales.

GENERALIDADES

Esta sección incluye la limpieza del terreno, zanjeo, colocación de la tubería, accesorios y válvulas, soportes y anclajes, prueba de presión, lavado y desinfección de la tubería y relleno de la zanja de acuerdo a lo indicado en los planos, descripción del proyecto y las especificaciones generales para cada operación.

Antes de iniciar el trabajo se deberán localizar las instalaciones y tuberías existentes para evitar dañarlas, marcándolas cuidadosamente. Es responsabilidad de la comunidad el daño que ocasione, así como el arreglo del material de acabado de calles que sea necesario remover.

Se colocarán indicaciones de peligro y las protecciones necesarias en los puntos dentro de poblaciones que sean de tránsito de vehículos o peatones.

Al terminar el trabajo debe retirarse todo material sobrante y efectuarse todas las reparaciones de daños ocasionados.

Las tuberías se colocarán en el lugar y niveles indicados en los planos o donde lo fijen las bases especiales, predominando las últimas.

Deberá utilizarse las herramientas adecuadas y métodos de trabajo recomendados por los fabricantes.



Cualquier pavimento que fuera necesario romper para instalar la tubería, deberá reponerse y dejarse en condiciones iguales o superiores a las que tenía antes de la instalación.

ZANJEO

Las tuberías se emplazarán siguiendo los ejes que se indiquen en los planos.

Se deberá cortar zanja simétrica al eje de instalación de la tubería dejando los siguientes recubrimientos sobre el diámetro del tubo; a menos que las bases especiales indique algo distinto.

En terrenos cultivados, caminos o áreas de tránsito liviano, 0.80 metros.

En caminos de tránsito pesado, 1.00 metro

Donde no exista posibilidad de tránsito o cultivo, 0.60 metros.

El fondo de la zanja deberá ser recortado cuidadosamente para permitir un apoyo uniforme de la tubería. En los casos de suelos que contengan piedras y pedruscos, se deberá remover todas las que aparezcan en el fondo de la zanja rellenando los espacios con material suelto compactado para uniformar el fondo de la zanja.

En los suelos con poca estabilidad se deberá apuntalar la zanja para evitar desplomes de las paredes, se deberá tomar las medidas necesarias para vaciar la zanja de agua proveniente de infiltración o lluvia por medio de desagüe en los puntos bajos, por bombeo o por tablestacados según convenga el caso, manteniéndola seca hasta que se rellene.

En los casos en que la tubería deba ser colocada en zanja cortada en roca, deberá excavarse la roca hasta un mínimo de 15 centímetros por debajo del nivel de instalación de la tubería, rellenándola posteriormente con material adecuado compacto para formar apoyo uniforme.

Si los materiales que se encuentran a la profundidad de instalación de la tubería no son satisfactorios porque pueden causar asentamientos desiguales; o ser agresivos a la tubería, se deberán remover en todo el ancho de la zanja en una profundidad de 0.20 metros, reponiéndolo con material satisfactorio debidamente compactado.

El ancho de la zanja, deberá ser suficiente para la correcta instalación de la tubería, así como para permitir una adecuada compactación del relleno a los lados de la misma.

Según el tipo de tubería que se use, podrá ser necesario hacer ampliaciones de la zanja en los puntos de unión o de instalación de accesorios, para permitir una adecuada instalación de las uniones.

En general, el ancho de la zanja a ser cortada por métodos manuales deberá ser entre 0.60 y 0.80 m según sea el caso, más el diámetro exterior de la tubería.

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC

Se cortará la tubería a escuadra; utilizando guías y luego se quitará la rebaba del corte y se limpiará el tubo de viruta interior y exteriormente. El tubo debe penetrar en el accesorio o campana de



otro tubo sin forzarlo por lo menos un tercio de la longitud de la copla, si no es posible debe afilarse o lijarse la punta del tubo.

Se aplicará el cemento solvente que debe estar completamente fluido y si el cemento empieza a endurecerse en el frasco, deberá desecharse.

Antes de aplicarse el cemento solvente se debe quitar toda clase de suciedad que se encuentra en la parte que se va a aplicar, tanto en el exterior del tubo como en la superficie interior del accesorio, por medio de un trapo seco.

El cemento debe ser aplicado en una capa delgada y uniforme; puede usarse cepillo o brocha. Se deberá hacer rápidamente, ya que el cemento seco en dos minutos aproximadamente. No se deberá exagerar el uso del solvente, sino que solo darles un revestimiento a las dos piezas.

Para el ensamble se deberá hacer una rotación de $\frac{1}{4}$ de vuelta, presionando el tubo cuando las superficies todavía estén húmedas, debiéndose dejar fija la unión por lo menos 30 minutos.

La tubería deberá colocarse cuidadosamente en la zanja y tener el cuidado al trabajarla que los operarios no se paren en ella.

La tubería se colocará en la zanja y se cubrirá dejando expuesta las uniones para hacer la prueba que más adelante se especifica.

Esta tubería deberá cubrirse en las primeras horas de la mañana cuando esté fría y no dilatada por la acción del calor.

RELLENO DE ZANJAS

Las zanjas de instalación de tubería, deberán ser rellenadas, tan pronto como se haya aprobado y aceptado la instalación. Las tuberías deberán enterrarse a una profundidad mínima de 0.60 metros sobre la corona del tubo. Si los terrenos son dedicados a la agricultura, la profundidad mínima será de 0.80 metros. En caminos, calles urbanas o paso de vehículos de carga, la profundidad de colocación no será menor a 1.20 metros.

El material de relleno no debe ser lanzado desde alturas superiores a 1.50 metros y debe estar libre de elementos de gran tamaño y peso. Se utilizará material granular fino o material seleccionado de la excavación, apisonándolo por medios manuales hasta alcanzar la compactación.

LAVADO Y DESINFECCIÓN INTERIOR DE LA TUBERÍA

Antes de poner en servicio las tuberías instaladas deberá procederse a lavarlas y desinfectarlas interiormente.

Primero se procederá al lavado para lo que se hará circular agua a velocidad no menor de 0.75 metros por segundo, por un período mínimo de 15 minutos o el tiempo necesario para que circule dos veces el volumen contenido por las tuberías, según el que sea mayor.

Para la desinfección se deberá comenzar por vaciar la tubería, llenándola después con agua que contenga 20 miligramos por litro de cloro, la que se mantendrá 24 horas en la tubería. Cuando no se pueda vaciar previamente la tubería, se introducirá un volumen dos veces mayor que el volumen



de agua contenido, proporcionando escapes en todos los extremos durante la aplicación del agua clorada para desinfección.

Después de las 24 horas, se vaciarán las tuberías o se procederá a lavarlas haciendo circular agua en cantidad suficiente para eliminar la empleada para desinfección. El agua a emplearse para el lavado final será de calidad igual a la que circulará por la tubería en su funcionamiento normal.

DISEÑO DE LA MEZCLA

CALIDAD DE LA MEZCLA

Todos los materiales a utilizarse deben de proporcionarse de tal manera que produzcan una mezcla bien graduada de alta densidad y máxima trabajabilidad con una resistencia a la compresión a los 28 días no menor a la especificada. Los agregados como arena y pedrín deben de estar limpios libres de tierra y otro tipo de materiales.

DOSIFICACIÓN DE AGREGADOS

Los agregados deberán medirse con precisión y mezclarse hasta lograr una apariencia uniforme. Para efectuar lo anterior, el contratista podrá dosificar las mezclas por volumen o por peso, según lo apruebe previamente la supervisión. Las mezcladoras deberán estar en perfecto estado de funcionamiento y con capacidad de producir mezclas uniformes con el revenimiento de acuerdo al diseño realizado. Se fabricará sólo la cantidad necesaria para el uso inmediato.

CONSISTENCIA

Se requiere uniformidad en la consistencia del concreto en los diferentes colados, por lo que cada etapa del manejo, transporte y colado del concreto deberá controlarse cuidadosamente para mantener dicha uniformidad. La consistencia del concreto deberá seleccionarse según los requerimientos de su uso.

DOSIFICACIÓN DEL AGUA

Para la dosificación del agua en mezclas, se tomará en cuenta el estado de humedad de los agregados al momento de su uso. La relación agua cemento, para la mezcla de concreto a utilizar en elementos estructurales primarios como cimentaciones, vigas, columnas, paredes y losas no deberá exceder de 0.50. En ningún momento o bajo ninguna circunstancia las mezclas podrán contener agua en cantidad mayor de la establecida en el diseño. Se prohíbe la producción de concreto de revenimiento excesivo o agregar agua (que exceda a la relación agua cemento de diseño) para compensar la pérdida de revenimiento como resultado de demoras en la entrega o en la colocación.

VACIADO DEL CONCRETO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Antes de comenzar a colocar el concreto, todas las superficies estarán, debidamente trazadas, niveladas y encofradas; deberán limpiarse, humedecerse bien y colocársele desencofrantes. Todo material extraño e inadecuado que se encuentre en la superficie a colar deberá ser removido. No se aceptará el colado de elementos sobre superficies que no hayan sido aprobadas por la supervisión. Tanto el encofrado como el equipo de transporte deberán estar libres de concreto endurecido o de cualquier material extraño inmediatamente antes del colado. Cuando la fundición



o vaciado se deposite directamente sobre suelo nivelado y compactado, se colocará plástico o una capa de mezcla para evitar que el agua del concreto sea absorbida por el suelo. Se podrán considerar los recubrimientos de acero de acuerdo al ACI.

REFUERZO Y EMPOTRADOS

Previo a cualquier colado, deberá estar completo el encofrado la armadura y/o cualquier dispositivo que deba quedar empotrado en el concreto debidamente aprobado por la supervisión. Deberá tenerse cuidado de que el acero de refuerzo quede rodeado de concreto y que no queden huecos o cavidades (zomperas o colmenas).

TEMPERATURA

Durante la colocación, la temperatura del concreto deberá ser respetada conforme los límites máximos y mínimos de fundición según lo indica el ACI. La temperatura del concreto depende de una serie de factores externos como son la temperatura ambiente, humedad relativa, velocidad del viento, las cuales en conjunto definen la velocidad de evaporación de la mezcla, establecida en el ACI 305 de 1 Kg/m²/hora como límite. No se podrán efectuar colados cuando la temperatura ambiente o calor latente, con la suficiente capacidad de provocar cambios a la temperatura del concreto, que lo haga exceder los 32°C (90°F), el cual es un parámetro promedio para condiciones consideradas estándar.

TIEMPO DE COLOCACIÓN

El concreto deberá ser conducido tan rápidamente como sea posible a su destino, previniendo la segregación y/o pérdidas con el fin de mantener uniforme la calidad requerida del concreto. Bajo ninguna circunstancia el tiempo entre el comienzo de la mezcla y la colocación del concreto no deberá exceder de 60 minutos.

SEGREGACIÓN

Los canales de conducción deberán revestirse de lámina galvanizada y debe tener el tamaño específico para empalmar la tolva de descarga y los canales de recorrido y la pendiente óptima evitando retenciones o acumulaciones de material, o por el contrario provocar segregaciones de los componentes de la mezcla.

DESCARGA DEL CONCRETO

La descarga del concreto podrá efectuarse con recipientes, tolvas, carritos propulsados a mano o con motor, conductos o tubos de caída, bandas transportadoras, aire comprimido, bombas, tubo embudo. Un requisito básico del equipo y métodos de colocación, como de todos los demás equipos y métodos de manejo, es que deberá conservar la calidad del concreto en lo referente a la relación agua cemento, revenimiento, contenido de aire y homogeneidad. Deberá evitarse la descarga a alta velocidad que origina la segregación del concreto y desde alturas muy grandes.

CAPACIDAD DE COLOCACIÓN

Debe preverse suficiente capacidad de colocación, mezclado y transporte, de manera que el concreto pueda mantenerse plástico y libre de juntas frías durante su colocación.



CURADO DEL CONCRETO

ESPECIFICACIÓN

El concreto deberá mantenerse a una temperatura de más de 10° C y en una condición húmeda, por al menos 14 días después del fundido (colado).

PROCESO

Inmediatamente después del fundido, el concreto deberá protegerse de la pérdida de humedad y daños mecánicos. Las superficies horizontales deberán cubrirse con una capa de arena solamente si las condiciones no permitan curar directamente con agua durante un período no menor de 14 días después del colado. Los encofrados que se encuentran en contacto con el concreto deberán mantenerse mojados durante por lo menos 7 días después del fundido. Si los moldes o formaletas fuesen removidos en ese lapso, la superficie del concreto se mantendrá húmeda hasta el término de los siete días. El agua que se utilice para el curado deberá ser potable.

Los tiempos para la remoción de las formaletas, contando a partir de la terminación de las fundiciones se especifican de la siguiente manera.

Vigas	14 días
Losas	14 días
Columnas de mampostería	2 días
Muros y contrafuertes	14 días
Faldones de vigas	7 días

COMPACTACIÓN Y RELLENO ESTRUCTURAL

El valor soporte del suelo deberá ser mejorado si las condiciones locales no cumplen con un valor soporte mínimo de 8 Ton/m². Para los rellenos se emplean materiales seleccionados limpios, naturales, adecuados para este fin.

El material a utilizar para relleno estructural deberá ser previamente aprobado por el supervisor. La compactación será mecánica extendiendo los materiales por estratos sucesivos, dándole el espesor que permitan los medios de compactación utilizados sin que estas sean mayores de 300 mm ni menores de 100 mm. Se humectarán las capas si fuera necesario para lograr una compactación correcta. Después de la compactación se harán las pruebas de laboratorio necesarias para determinar si se obtuvo el valor soporte de suelo requerido.

MATERIALES

TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC

La tubería de PVC (cloruro de polivinilo rígido) será rígida y debe satisfacer la norma ASTM D 2241.



Las presiones que deberá cumplir la tubería serán: Para tubo de ½" de 315 PSI, para tubo de ¾" de 250 PSI, para tubo de diámetro igual o mayor de 1", la presión que se indique en las bases especiales o en los planos. Las uniones deben ser conectadas por medio de campana y espiga.

Los accesorios serán de la misma clase, para una presión mínima de 160 libras/pulg², para tubos de diámetro mayor a 1" y 315 libras/pulg² para diámetros menores.

El solvente será recomendado por el fabricante de la tubería.

Los materiales serán almacenados en una forma que garantice la preservación de calidad y se colocarán de manera que permitan una fácil inspección.

Se almacenarán bajo techo o a la intemperie protegidos de forma que no reciban directamente los rayos del sol.

Los tubos no deben apilarse a más de 60 centímetros de altura y deben tomarse las precauciones necesarias para que no se camine sobre ellos.

MATERIAL DE RELLENO Y COMPACTACIÓN

El tamaño máximo del agregado que contenga el material de relleno, no debe exceder de 70 milímetros ni exceder de ½ espesor de la capa. El material no debe tener más del 50% en peso de partículas que pasen el tamiz 0.425 mm, ni más del 25% en peso, de partículas que pasen el tamiz 0.075 mm.

Impurezas: todo material para compactación debe estar exento de materias vegetales, basura, terrones de arcilla, o sustancias que incorporadas dentro de la capa puedan causar fallas

CONCRETO CICLÓPEO

Material compuesto de piedra bola en un 67%, con un 33% de mortero. El mortero será un concreto compuesto de cemento, arena de mina triturada certificada y piedrín triturado certificado en una proporción volumétrica 1:2:3.

CONCRETO

Material compuesto de cemento, arena y piedrín en una proporción volumétrica 1:2:3 o con una proporción que garantice una resistencia $f'c = 210 \text{ Kg/cm}^2$ (3,000 psi). Las proporciones de agregados y cemento para cualquier resistencia de concreto serán tales que produzcan una mezcla trabajable, de tal manera que, con el método de colocación y compactación empleado en la obra, llegue a todas las esquinas y ángulos del encofrado y envuelva completamente el acero de refuerzo, pero sin permitir que los materiales segreguen o que se acumule exceso de agua libre sobre la superficie.

MAMPOSTERÍA DE PIEDRA

Material compuesto de piedra bola en un 67% con un 33% de mortero. El mortero se realizará con cemento y arena de mina triturada certificada en una proporción 1:2.



ALISADO

Material que se colocará en la impermeabilización interna de todas las cajas o depósitos principales que guarden agua. El mortero que se utilizará será de cemento y arena de mina triturada certificada en una proporción 2:1.

REPELLO

Material que se colocará en la parte externa de todas las cajas o depósitos, el cual se realizará con un mortero con una proporción 1:2 de cemento y arena de mina triturada certificada.

REFUERZO

Se hará con varillas de acero especificado en planos y con una resistencia no menor a 2810 Kilogramos/centímetro cuadrado (40,000 psi) Grado 40 a menos que en los planos se indique una resistencia mayor.

CEMENTO

El cemento que se usará será portland tipo I, nacional o importado y deberá llenar las especificaciones C-150 de la ASTM. El transportar el cemento en bolsas, éstas tendrán que estar perfectamente cerradas y alejadas de la humedad. Se rechazará el cemento que llegue a la obra en bolsas rotas. El cemento será dispuesto en un almacén previsto en la obra, con ambiente seco y protegido contra la humedad; de tal forma que permita el fácil acceso y adecuada inspección e identificación de las remesas. Será colocado sobre plataformas de madera levantadas 15 cm sobre el piso y protegido convenientemente de la acción del clima.

No se permitirá almacenar el cemento en estibas de más de ocho bolsas. No se permitirá el uso de cemento endurecido por almacenamiento o parcialmente fraguado; cualquier cemento que haya sido afectado por la humedad, o por otras causas, será retirado inmediatamente de la obra. Podría aceptarse el uso de cemento 5800 PSI.

AGREGADO FINO

Se entenderá por agregado fino a aquella parte de los agregados que pasa la malla No. 4 (4.76 mm) y es retenido en la malla No. 200 (0.0074 mm) de graduación US Standard. La arena estará formada por partículas sanas, duras, exentas de polvo, grasas, sales, álcalis, sustancias orgánicas y otras perjudiciales para el concreto. Condiciones de uso. Los porcentajes en peso de sustancias perjudiciales en la arena para su uso, en la fabricación del concreto, no excederán los valores indicados en la siguiente tabla:

Tipo de material	% en peso
Material que pasa el tamiz No. 200 (ASTM c-117)	3%
Arcillas (ASTM c-142)	1%



Total otras partículas (álcali, mica, granos recubiertos, limo, etc.)	2%
Suma máxima de sustancias perjudiciales	6%

La arena deberá almacenarse de manera tal que evite la contaminación. Además, la arena utilizada para la mezcla del concreto será de mina triturada certificada bien graduada y al probarse por medio de mallas estándar (ASTM C-135), deberá satisfacer los límites siguientes:

Malla	% que pasa
3/8"	100
N° 4	90-100
N° 8	70-85
N° 16	50-85
N° 30	30-70
N° 50	10 a 45
N° 100	0-10

El módulo de fineza de la arena está entre los valores de 2.50 a 2.90, sin embargo, la variación del módulo de fineza no excederá de 0.30.

AGREGADO GRUESO

El agregado grueso para el concreto consistirá de pedrín triturado certificado o pedrín azul, proveniente de roca sana y compacta, libre de impurezas, la grava deberá ser roca dura y cristalina, libre de pizarra, laja o piezas en descomposición

El agregado grueso a aquella parte de los agregados que no pasa la malla No. 4 (4.76 mm). El tamaño máximo del agregado no deberá ser mayor de 1/5" de la dimensión menor entre los lados de los moldes de los miembros en el cual se va a usar el concreto, ni mayor de 3/4" de la separación mínima entre barras o paquetes de barras de refuerzo.

Condiciones de uso: los porcentajes en peso de sustancias dañinas no excederán los valores siguientes:

Tipo de agregado grueso	% en peso
Material que pasa el tamiz No. 200	(ASTM c-117) 0.5%
Materiales ligeros	(ASTM c-330) 2.0%
Terrones de arcillas	(ASTM c-124) 0.5%
Total de otras sustancia dañinas	1.00%
Suma máxima de sustancias dañinas	3.00%

Los agregados gruesos no serán aceptados, si no cumplen lo siguiente:

Prueba de desgaste o absorción (ASTM C-131), si la pérdida usando la graduación estándar (tipo a) supera el 10% en peso, para 100 revoluciones ó 40% en peso para 500 revoluciones. Resistencia a la acción del sulfato de sodio (ASTM C-88), si la pérdida media en peso, después de 5 ciclos, supera el 14%. Si el peso específico del material, en estado de saturación con superficie seca, es inferior a 2.58 g/cm³ (ASTM c-127).

BLOCK VACÍO DE CONCRETO

El block de concreto para muros debe cumplir con los requisitos que se detalla en AGIES NSE 4-1. Tener como mínimo una resistencia a la compresión medida sobre el área bruta de 35 Kg/cm² o 3.50 MPa. Y con las medidas especificadas en planos.

Las unidades perforadas pueden tener hasta un 65% de vacíos, medido en un plano paralelo al plano sobre el cual se sienta. Las celdas que se usen para colocar barras de refuerzo no pueden tener ninguna dimensión menor de 50 mm ni áreas menores de 30.00 cm². La pared entre celdas debe tener un espesor mayor que 13 mm y la pared exterior debe tener un espesor mayor o igual a 25 mm.

MADERA

La formaleta deberá diseñarse para producir un concreto endurecido que tenga la forma, los alineamientos y las dimensiones que se muestren en los planos. En consecuencia, la madera que se utilice para formaletas estará de acuerdo con este propósito y las condiciones adicionales que se dan a continuación.

La madera que se une en la construcción de las formaletas para las estructuras de concreto será laminada o deberá ser cepillada o machihembrada del lado de la superficie que haya de quedar expuesta. Deberá estar exenta de bombeos, abultamientos y nudos flojos, ser sana y de espesor uniforme. La madera sin ser cepillada de no más de 20 cm de anchura de bordes sanos y cuadrangulares, podrá usarse para respaldar superficies que no hayan de quedar expuestas al finalizar la obra. Las formaletas para las superficies a la vista deberán ser colocadas de madera



regular con la mayor dimensión de los paneles en el sentido vertical y todas las juntas alineadas. La formaleta no deberá producir superficies cóncavas o irregulares. La desviación máxima de la superficie plana no deberá exceder de 2 mm, por metro.

AGUA

El agua debe ser limpia, libre de residuos de aceite, ácidos, sales, álcalis, cloruros, materiales orgánicos y otras sustancias extrañas que puedan ser dañinas para el mortero o cualquier metal embebido en el concreto. El agua deberá estar conforme a la norma AASHTO t-26-94 y la turbidez no excederá de 2000 partes por millón.

CAL

Cal hidratada cumpliendo con la norma COGUANOR NGO 41018.

SEGURIDAD

En todas las tapaderas del proyecto se anclarán ganchos de acero de 1/2" de tal forma que puedan cerrarse con candado.

Bibliografía

- Municipalidad de Nahualá
Nahualá, 2020
Plan Estratégico Institucional
- Proyecto paisajes productivos resilientes
al cambio climático y redes socio económicas fortalecidas en Guatemala
2016
Caracterización biofísica de la cuenca del río Nahualate y las 19 sub -cuencas de interés para el proyecto Guatemala,
- AMSCLAE
Autoridad para el manejo de la cuenca del lago de Atitlán y su entorno
Priorización de cuencas Panajachel, 2018
- MAGA-UPIED / BID
Ing. Agr. Hugo Tobías
Primera aproximación al mapa de clasificación taxonómica de los suelos de



la república de Guatemala, Guatemala, 2000
